



REPÚBLICA
PORTUGUESA

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

1. Por determinação de Sua Excelência o Presidente da A.R. ao Senhor Presidente do 1.º Conselho.
 2. Colocamento à DAP.
- mt
2 set. 2020.

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Presidente da Assembleia da República
Dra. Maria José Ribeiro

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		N.º: 3413 ENT.: 4960 PROC. N.º:	02/09/2020

ASSUNTO: Relatório de Execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna

Encarrega-me o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares de enviar o Relatório de Execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, conforme solicitado pelo Gabinete do Senhor Ministro da Administração Interna, em cumprimento do disposto no artigo 190.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Catarina Gamboa

Catarina Gamboa

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Gabinete do Presidente
N.º de Entrada <u>662106</u>
Classificação <u>06/02/03</u>
Data <u>02/09/2020</u>

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Divisão de Apoio às Comissões CACDLG
N.º Único <u>662106</u>
Inscrição de n.º <u>826</u> Data <u>05/09/2020</u>

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

1000

1000

1000

1000

1000

1000

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO INTERCALAR

Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança

agosto 2020

Índice Geral

1. Introdução.....	6
2. A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS) 7	
3. Execução da LPIEFSS - 1.º Semestre de 2020	12
4. Indicadores de Execução Orçamental.....	14
4.1. Ótica da Receita	14
4.2. Ótica da Despesa.....	15
5. Indicadores de Execução Material.....	19
5.1. Medida - Infraestruturas.....	19
5.2. Medida - Veículos.....	28
5.3. Medida - Armamento.....	31
5.4. Medida - Equipamento de Proteção Individual	34
5.5. Medida - Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	38
5.6. Medida - Equipamentos para Funções Especializadas	41
5.7. Medida - STIC.....	44
6. Conclusões	49

Índice de Quadros

QUADRO 1 – MAPA DE PROGRAMAÇÃO DA LPIEFSS NO PERÍODO 2017-2021	8
QUADRO 2 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, EM 2017	9
QUADRO 3 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, EM 2018	9
QUADRO 4 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, EM 2019	9
QUADRO 5 – INDICADORES DE EXECUÇÃO MATERIAL - 2017 A 2019	11
QUADRO 6 – INDICADORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 2020 - ÓTICA DA RECEITA	14
QUADRO 7 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA LPIEFSS, ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020	15
QUADRO 8 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR MEDIDAS DA LPIEFSS, ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020	15
QUADRO 9 - POSIÇÃO ORÇAMENTAL POR MEDIDA LPIEFSS - ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020	16
QUADRO 10 - DETALHE DAS DOTAÇÕES DA MEDIDA ARMAMENTO POR FSS	17
QUADRO 11 - DETALHE DAS DOTAÇÕES DA MEDIDA EAAOP POR FSS	17
QUADRO 12 - DETALHE DAS DOTAÇÕES DA MEDIDA EFE POR FSS	17
QUADRO 13 - DETALHE DAS DOTAÇÕES DA MEDIDA EPI POR FSS	17
QUADRO 14 - DETALHE DAS DOTAÇÕES DA MEDIDA STIC POR BENEFICIÁRIO	18
QUADRO 15 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA EM 2020	18
QUADRO 16 – INDICADORES DE EXECUÇÃO MATERIAL	19
QUADRO 17 – SITUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA MEDIDA INFRAESTRUTURAS	20
QUADRO 18 – EMPREITADAS E SERVIÇOS COM ENCARGOS ASSUMIDOS – INFORMAÇÃO ADICIONAL AO PA 2020	23
QUADRO 19 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E ESCALONAMENTO PLURIANUAL	24
QUADRO 20 - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADOS COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	25
QUADRO 21 – EMPREITADAS E SERVIÇOS CONEXOS EM FASE DE LANÇAMENTO-GNR	26
QUADRO 22 – EMPREITADAS E SERVIÇOS CONEXOS EM FASE DE LANÇAMENTO-PSP	27
QUADRO 23 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – PROCEDIMENTOS TRANSITADOS DE 2019 - MEDIDA VEÍCULOS	28
QUADRO 24 – INDICADOR DE EXECUÇÃO MATERIAL – MEDIDA VEÍCULOS	29
QUADRO 25 – INDICADOR DE EXECUÇÃO MATERIAL DOS VEÍCULOS PREVISTOS ENTREGAR EM 2020	30
QUADRO 26 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – PROCEDIMENTOS TRANSITADOS DE 2019 – MEDIDA ARMAMENTO	31
QUADRO 27 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – NOVAS NECESSIDADES – MEDIDA ARMAMENTO	31
QUADRO 28 – INDICADOR DE EXECUÇÃO MATERIAL DO ARMAMENTO PREVISTO ADQUIRIR EM 2020	32
QUADRO 29 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – PROCEDIMENTOS TRANSITADOS DE 2019 – MEDIDA EPI	34
QUADRO 30 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – NOVAS NECESSIDADES REAJUSTADAS – MEDIDA EPI	35
QUADRO 31 – INDICADOR DE EXECUÇÃO MATERIAL DE EPI'S PREVISTOS ADQUIRIR EM 2020	36
QUADRO 32 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – PROCEDIMENTOS TRANSITADOS DE 2019 – MEDIDA EAAOP	38
QUADRO 33 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – NOVAS NECESSIDADES – MEDIDA EAAOP	38
QUADRO 34 – INDICADOR DE EXECUÇÃO MATERIAL DO EAAO PREVISTO ADQUIRIR EM 2020	39
QUADRO 35 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – PROCEDIMENTOS TRANSITADOS DE 2019 – MEDIDA EFE	41
QUADRO 36 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – NOVAS NECESSIDADES – MEDIDA EFE	42
QUADRO 37 – INDICADOR DE EXECUÇÃO MATERIAL DOS EFE'S PREVISTOS ADQUIRIR EM 2020	42
QUADRO 38 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – PROCEDIMENTOS TRANSITADOS DE 2019 – MEDIDA STIC	44
QUADRO 39 – PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2020 – NOVAS NECESSIDADES – MEDIDA STIC	45
QUADRO 40 – INDICADOR DE EXECUÇÃO MATERIAL DO EQUIPAMENTO DE STIC PREVISTO ADQUIRIR EM 2020	46
QUADRO 41 – EXECUÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA OUTROS PROJETOS – MEDIDA STIC	48

Índice de Gráficos

GRÁFICO 1 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2017 A 2019	10
GRÁFICO 2 – QUANTIDADE DE VEÍCULOS ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	30
GRÁFICO 3 – ENCARGOS COM OS VEÍCULOS ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	30
GRÁFICO 4 – QUANTIDADE DE ARMAS E ACESSÓRIOS ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	33
GRÁFICO 5 – ENCARGOS COM ARMAS E ACESSÓRIOS ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	33
GRÁFICO 6 – QUANTIDADE DE EPI'S ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	36
GRÁFICO 7 – ENCARGOS COM EPI'S ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	37
GRÁFICO 8 – QUANTIDADE DE EAAO ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	39
GRÁFICO 9 – ENCARGOS COM OS EAAO ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	40
GRÁFICO 10 – QUANTIDADE DE EFE'S ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	42
GRÁFICO 11 – ENCARGOS COM OS EFE'S ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	43
GRÁFICO 12 – QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS STIC ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	47
GRÁFICO 13 – ENCARGOS COM OS EQUIPAMENTOS STIC ENTREGUES E A ENTREGAR POR FSS, EM 2020	47

Siglas, acrónimos e abreviaturas

Código dos Contratos Públicos	CCP
Divisão de Programação de Infraestruturas e Equipamentos	SGMAI-DPIE
Equipamentos de Apoio à Atividade Operacional	EAAOp
Equipamentos de Proteção Individual	EPI
Equipamentos para Funções Especializadas	EFE
Forças e Serviços de Segurança	FSS
Forças de Segurança	FS
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna	GSEAAI
Guarda Nacional Republicana	GNR
Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança	LPIEFSS
Plano de Aquisições para 2020	PA2020
Polícia de Segurança Pública	PSP
Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna	SGMAI
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	SEF
Sistema de Tecnologias de Informação e Comunicação	STIC

1. Introdução

A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS), aprovada pela Lei n.º 10/2017, de 3 de março, estabelece a programação dos investimentos na modernização e operacionalidade das FSS sob tutela do membro do Governo responsável pela área da administração interna, para o quinquénio de 2017 -2021. A programação referida prevê os encargos com investimentos em instalações, sistemas de tecnologias de informação e comunicação, veículos, armamento e outro equipamento necessário à prossecução das competências e atribuições das FSS.

Encontra-se prevista no artigo 190.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, a elaboração de um relatório de execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, com a especificação dos investimentos realizados, em curso e a realizar até ao final do ano em infraestruturas das forças e serviços de segurança, a ser enviado à Assembleia da República.

Assim, o presente relatório reúne a informação necessária ao controlo da execução da LPIEFSS, com referência a 30 de junho de 2020, com o objetivo de permitir um melhor acompanhamento do 1º semestre, de 2020.

Este relatório evidencia a execução de cada medida, nas perspetivas orçamental e material, decorrentes dos contratos celebrados e compromissos assumidos bem como as responsabilidades futuras que deles resultam.

As entidades beneficiárias, a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), colaboram com a SGMAI no planeamento, execução e monitorização da LPIEFSS.

Para a elaboração do presente Relatório, foram recolhidos contributos das seguintes unidades orgânicas da SGMAI:

- Direção de Serviços de Gestão Orçamental e Financeira;
- Direção de Serviços da Unidade Ministerial de Compras;
- Divisão de Programação de Equipamentos e Infraestruturas.

Como nota prévia, importa referir que todos os montantes apresentados em euros (€), incluem Imposto de Valor Acrescentado (IVA).

2. A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS)

A LPIEFSS, publicada em 2017, veio instituir um novo modelo de gestão estrutural e plurianual dos investimentos, que assenta numa estrutura executiva da responsabilidade do membro do Governo responsável pela Administração Interna, uma entidade coordenadora, na figura da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) que assegura a sua gestão, a monitorização das execuções orçamental e material, a elaboração dos procedimentos de contratação e a elaboração dos relatórios periódicos.

No âmbito da LPIEFSS são beneficiárias pelos investimentos programados, no período 2017-2021, duas Forças de Segurança - a GNR e a PSP– e um Serviço de Segurança - o SEF.

Adicionalmente, a SGMAI é beneficiária da LPIEFSS no âmbito da medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação (STIC), em projetos que têm um carácter transversal às Forças e Serviços de Segurança (FSS).

O ano de 2017 foi o primeiro ano de execução da LPIEFSS, em que foi necessário adequar as estruturas a um novo modelo de gestão de investimentos e, necessariamente, a novos processos de trabalho, quer ao nível do planeamento, como da execução e da monitorização, obrigando ainda à definição de novos modelos de articulação entre as diversas entidades envolvidas.

Considerando que grande parte do investimento é realizado em benefício direto da GNR e da PSP, a SGMAI-DPIE foi estrategicamente dotada com recursos humanos qualificados das supracitadas forças de segurança (FS) para integrar a referida unidade, que apesar da constante mobilidade dos seus quadros e em défice atual, fomentou e fomenta a criação de condições orgânicas e funcionais para integrar a estrutura na SGMAI, garantindo-se a sua permanente articulação com a tutela setorial e com os seus beneficiários diretos.

Desde a criação da DPIE foram identificadas algumas oportunidades de melhoria na gestão das medidas da LPIEFSS que pretendem incrementar a economia, a eficiência e a eficácia, designadamente nos procedimentos promovidos por esta divisão e que passam, entre outros, por uma expedita articulação entre a SGMAI e as FSS.

No Quadro 1, apresentam-se os investimentos estimados e preconizados na Lei nº10/2017, de 3 março, repartidos por sete medidas, no horizonte temporal de 2017 a 2021, constituindo o seu planeamento macro:

Quadro 1 – Mapa de Programação da LPIEFSS no período 2017-2021

(um: EUR)

Medida	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Infraestruturas	18.280.278	19.648.614	22.261.725	23.476.425	23.087.053	106.754.095
Veículos	4.155.000	11.120.000	16.100.000	15.400.000	15.500.000	62.275.000
Armamento	2.138.000	980.000	3.630.000	1.050.000	1.380.000	9.178.000
Equipamento de Proteção Individual	2.285.000	1.460.000	1.280.000	1.280.000	1.310.000	7.615.000
Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
Equipamento para Funções Especializadas	3.066.546	2.865.000	1.890.000	1.960.000	2.320.000	12.101.546
Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação	60.496.661	53.847.871	44.759.760	46.755.060	46.324.432	252.183.784
Total	90.921.485	90.921.485	90.921.485	90.921.485	90.921.485	454.607.425

Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 2.º da LPIEFSS, as dotações orçamentais que se encontram no Mapa de Programação são inscritas ou transferidas para divisão própria do orçamento de projetos da SGMAI.

A determinação da execução da programação financeira da LPIEFSS desde 2017 incorpora os impactos resultantes dos ajustamentos decorrentes de saldos transitados, alterações orçamentais e da aplicação de cativos nas dotações iniciais de cada medida, constantes do Mapa de Programação da LPIEFSS.

Assim, o nível de execução é determinado tendo por base a dotação disponível face à execução financeira realizada em cada ano, a qual engloba os pagamentos realizados pela SGMAI e as transferências para as FSS relacionados com o investimento realizado, no âmbito da LPIEFSS.

Nos quadros seguintes são apresentados os indicadores de execução financeira da LPIEFSS, para cada uma das medidas, desde 2017 a 2019, o que se pode concluir que a média da execução financeira nestes 3 últimos anos ronda os 62,85%, um pouco abaixo do que seria expectável.

Quadro 2 – Indicadores de Execução Financeira, em 2017

(um: €)

Execução LPIEFSS	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	18 230 278	4 155 000	2 138 000	2 285 000	500 000	3 066 546	60 496 661	90 871 485
Ao entre medidas (2)	0	-1 041 291	0	0	0	-709 145	1 750 436	0
Saldos transitados e AO para outros projetos (3)	0	0	0	0	0	0	350 414	350 414
Dotação Corrigida (4) = (1) + (2) + (3)	18 230 278	3 113 709	2 138 000	2 285 000	500 000	2 357 402	62 597 511	91 221 899
Cativo (5)	0	1 858 125	0	0	54 631	335 059	12 229 577	14 477 392
Dotação corrigida líquida de cativos (6) = (4) - (5)	18 230 278	1 255 584	2 138 000	2 285 000	445 369	2 022 343	50 367 934	76 744 507
Pagamentos (7)	1 442 042	0	887 783	493 946	53 339	425 727	49 646 148	52 948 986
Transferências para as FSS (8)	2 504 341	1 255 584	79 824	0	391 537	344 111	68 665	4 644 062
Saldo da medida (9) = (6) - (7) - (8)	14 283 895	0	1 170 393	1 791 054	493	1 252 504	653 121	19 151 459
Execução financeira (10) = (7) + (8)	3 946 383	1 255 584	967 607	493 946	444 876	769 838	49 714 813	57 593 048
Execução financeira % (11) = (10) / (6)	21,65%	100,00%	45,26%	21,62%	99,89%	38,07%	98,70%	75,05%

Quadro 3 – Indicadores de Execução Financeira, em 2018

(um: EUR)

Descrição	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	19 598 614	11 120 000	980 000	1 460 000	1 000 000	2 865 000	53 847 871	90 871 485
Saldos da Gerência Anterior (2)	12 124 944		1 170 393	1 791 054				15 086 391
Reforços da LPIEFSS - Dotação Centralizada combate a Incêndios e projeto Cadernos Eleitorais e projeto Modernização da SGMAI (3)							8 997 778	8 997 778
Crédito Especial de RP (4)							1 922 650	1 922 650
Transferências para as FSS (5)	2 313 424							2 313 424
Alterações orçamentais entre medidas (6)	0	-2 857 990	0	0	0		2 857 990	0
Dotação Corrigida (7) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) + (6)	29 410 134	8 262 010	2 150 393	3 251 054	1 000 000	2 865 000	67 626 289	114 564 880
Cativo (8)	0	1 390 001	0	0	125 000	358 125	6 023 294	7 896 420
Dotação corrigida líquida (9) = (7) - (8)	29 410 134	6 872 009	2 150 393	3 251 054	875 000	2 506 875,0	61 602 995	106 668 460
Pagamentos (10) (*)	967 951	2 986 592	1 437 893	1 844 582	417 361	1 587 575	51 864 524	61 106 479
Saldo da medida (11) = (9) - (10)	28 442 183	3 885 417	712 500	1 406 472	457 639	919 300	9 738 471	45 561 981
Execução financeira (12) = (10) + (5)	3 281 375	2 986 592	1 437 893	1 844 582	417 361	1 587 575	51 864 524	63 419 903
Execução financeira % (13) = (12) / ((9) + (5))	10,34%	43,46%	66,87%	56,74%	47,70%	63,33%	84,19%	58,19%

(*) A dotação corrigida da medida Infraestruturas, não considera o valor de 215.803,00 inicialmente considerado como saldo transitado de RG


(*) O pagamento da medida infraestruturas não considera o valor pago à própria entidade com vista ao processo de transição de saldos de RG

Quadro 4 – Indicadores de Execução Financeira, em 2019

Descrição	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	22 233 663	16 100 000	3 630 000	1 280 000	1 000 000	1 890 000	53 180 442	99 314 105
Saldos da Gerência Anterior aplicados em despesa (2)	26 972 562		712 500	1 406 471				29 091 533
Crédito Especial de RP (4)	916 798							916 798
Transferências para as FSS (5)	1 921 697	1 352 797						3 274 494
Alterações orçamentais entre medidas (6)	-6 839 195	6 839 195	0	0	0	0	0	0
Dotação Corrigida (7) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) + (6)	41 362 131	21 586 398	4 342 500	2 686 471	1 000 000	1 890 000	53 180 442	126 047 942
Cativo (8)	0	2 012 500	0	0	125 000	236 250	2 497 188	4 870 938
Dotação corrigida líquida (9) = (7) - (8)	41 362 131	19 573 898	4 342 500	2 686 471	875 000	1 653 750,0	50 683 254	121 177 004
Pagamentos (10)	4 477 974	19 514 876	828 664	1 497 733	802 132	744 149	37 688 613	65 554 141
Saldo da medida (11) = (9) - (10)	36 884 157	59 022	3 513 836	1 188 738	72 868	909 601	12 994 641	55 622 863
Execução financeira (12) = (10) + (5)	6 399 671	20 867 673	828 664	1 497 733	802 132	744 149	37 688 613	68 828 635
Execução financeira % (13) = (12) / ((9) + (5))	14,79%	99,72%	19,08%	55,75%	91,67%	45,00%	74,36%	55,31%

No Gráfico seguinte é apresentado um resumo desde 2017 a 2019, com base nos dados dos quadros anteriores, referente às dotações iniciais, às cativações, dotações corrigidas líquidas, pagamentos, saldos apurados anualmente e a execução financeira que engloba os pagamentos e as transferências para as FSS.

Gráfico 1 – Indicadores de Execução Financeira - 2017 a 2019

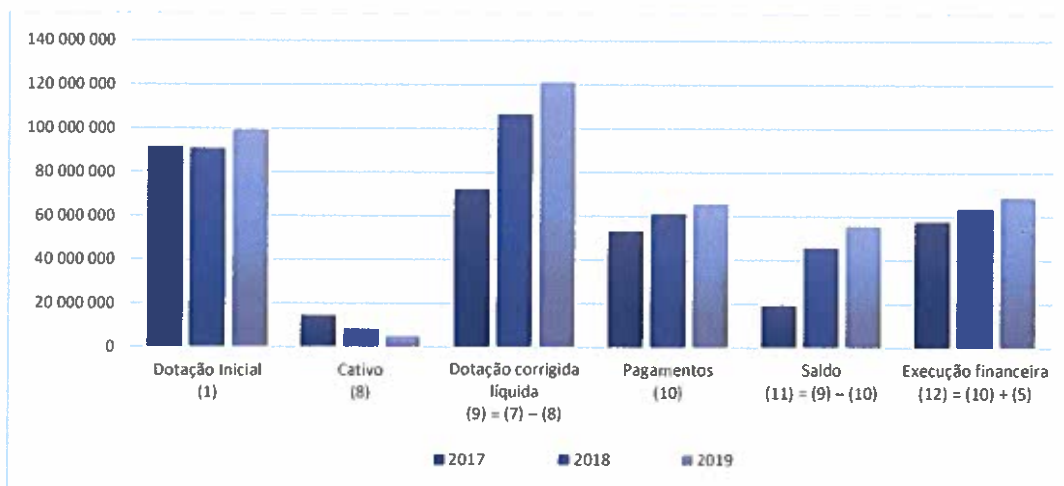

Em conclusão, com base nos quadros e gráfico anterior, podemos aferir que devido à baixa execução financeira da medida infraestrutura, a execução financeira no geral encontra-se aquém do esperado. De qualquer forma esta medida é a que tem um maior hiato temporal, que poderá passar por 3 anos, entre a decisão da necessidade de intervenção numa determinada instalação e a sua efetiva conclusão, pois existe a necessidade de elaboração de um estudo prévio e o respetivo projeto de execução, prévios à contratação da empreitada, bem como a tramitação pré-contratual tanto do projeto de execução como da empreitada implicando, invariavelmente, a autorização da assunção dos encargos plurianais.

No quadro seguinte são apresentados os indicadores de execução material da LPIEFSS, para cada uma das medidas, desde 2017 a 2019.

Relativamente à execução material da medida infraestruturas devido à sua especificidade, foi apenas considerado para efeitos de apuramento o nº de empreitadas concluídas nesse ano.

Relativamente à execução material da medida STIC apenas foram consideradas a aquisições, no âmbito do projeto 10359.

Quadro 5 – Indicadores de Execução Material - 2017 a 2019

Descrição	2017	2018	2019	Total
Infraestruturas - Nº de Empreitadas Concluídas	17	23	10	50
Veículos	48	260	677	985
Armamento	4 592	7 132	555	12 279
Equipamento de Proteção Individual	1 083	20 049	6 703	27 835
Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	2 978	3 294	8 873	15 145
Equipamento para Funções Especializadas	3 092	724	269	4 085
Equipamentos - STIC	32	1 041	12 890	13 963
Execução Material	11 842	32 523	29 977	74 342

3. Execução da LPIEFSS - 1.º Semestre de 2020

Para efeitos de planeamento, controlo e monitorização da execução da LPIEFSS, anualmente, é elaborado um Plano de Aquisições com vista a ser aprovado pela tutela setorial.

Para as medidas de Armamento, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Apoio à Atividade Operacional (EAAOp) e Equipamentos para Funções Especializadas (EFE), as necessidades aquisitivas planeadas são atualizadas anualmente, de acordo com as dotações disponíveis e as prioridades operacionais definidas pelas FSS.

A estratégia de aquisições plurianuais vastamente aplicada nos anos transatos da Lei, nas restantes medidas – Veículos, Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC), Infraestruturas - reflete-se na execução de 2020 e futuramente na de 2021, tendo-se procurado projetar as necessidades para todo o horizonte temporal da LPIEFSS, com vista à sua programação e satisfação de forma faseada e expectável.

Para a medida Veículos, os resultados da estratégia adotada consubstanciaram-se no lançamento da contratação centralizada de veículos, num alargado espectro de afetações e excedendo as 2000 unidades, procedimentos esses legitimados e refletidos no estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2017, de 28 de junho¹, e que envolve uma despesa global de cerca de 50 milhões de euros, ocorrendo a entrega de veículos entre os anos de 2018 e 2021, esperando-se para 2020 um total de 583 Veículos, grande parte deles já entregues.

No caso da medida de Infraestruturas, a estratégia de contratação dos projetos de execução assenta nos mesmos princípios, contudo, a especificidade do objeto de cada contrato obriga também a uma criteriosa definição das prioridades. Assim foram identificadas as infraestruturas com necessidades prioritárias, contratualizando-se ou iniciando-se os diversos projetos de execução e aquisição dos demais estudos e serviços necessários ao lançamento das empreitadas. Neste sentido, a execução desta medida tem assumido um carácter plurianual, quer pelas características das intervenções, ao nível da sua complexidade e dimensão, quer também pelas vicissitudes associadas ao desenvolvimento de empreitadas, onde se pode incluir a imperatividade de trabalhos complementares e a formalização de ligação a diversos serviços que podem, de forma alheia, causar a transição para os anos seguintes da data de conclusão de diversos investimentos.

¹ Publicada no Diário da República n.º 123, 1.ª Série, de 28 de junho.
Relatório Intercalar de Execução de 2020
Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança

A 11 de maio foi aprovado o Plano de Aquisições para 2020, contudo após a sua aprovação verificou-se a necessidade da sua adequação ao limite do montante dos saldos transitados.

Neste sentido, procedeu-se à sua adequação e adaptação, com o mínimo de recurso à medida infraestrutura conforme Despacho de Sua Ex^ª o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna aquando da aprovação do Plano de Aquisições de 2020.

Circunstancial e inevitavelmente, a pandemia causada pelo vírus *Covid-19* a nível mundial impôs, novos e elevados, desafios à SGMAI, às FSS e ao mercado, colocando a disponibilidade e prontidão dos operadores económicos em perspetiva e limitando o lançamento de procedimentos, bem como a capacidade de mobilização e deslocação que está inerente à forma como a Medida Infraestruturas é executada.

Relativamente à execução material e financeira da medida infraestrutura é de referir que devido à necessidade de autorização prévia da Sr^ª Secretária de Estado do Orçamento, de forma a dar cumprimento ao nº 1 do artigo 64.º da LOE de 2020, para lançar novos procedimentos, tendo em vista a aquisição de contratos de prestação de serviços prévios ao lançamento das empreitadas, nomeadamente no âmbito de estudos prévios, projetos de execução e serviços de fiscalização, algumas necessidades aquisitivas encontram-se suspensas, o que conduz invariavelmente ao atraso na contratação.

4. Indicadores de Execução Orçamental

4.1. Ótica da Receita

Nos termos do artigo 3.º da LPIEFSS o financiamento da mesma é assegurado por:

- a) Receitas gerais provenientes do Orçamento do Estado;
- b) 20 % da receita das forças de segurança proveniente das coimas por infrações rodoviárias prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 369/99, de 18 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro;
- c) Um terço da receita proveniente das coimas por infrações rodoviárias prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 369/99, de 18 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro;
- d) 20 % da receita das forças e serviços de segurança na taxa de segurança aeroportuária prevista na alínea a) do artigo 49.º e no n.º 1 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 254/2012, de 28 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 108/2013, de 31 de julho;
- e) Verbas provenientes do Fundo de Garantia Automóvel para as forças de segurança, nos termos da alínea d) do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de agosto;
- f) Receita correspondente a 90 % do valor da alienação ou de outras modalidades de rentabilização dos imóveis afetos às forças e serviços de segurança e dos imóveis anteriormente afetos aos extintos governos civis; e
- g) Outras receitas não previstas nas alíneas anteriores, designadamente as provenientes de financiamento autárquico e comunitário, nos casos aplicáveis.

Na presente data as receitas gerais do Orçamento de Estado contribuem com cerca de 35,52% do financiamento da LPIEFSS, conforme se verifica no quadro seguinte:

Quadro 6 – Indicadores de Execução orçamental em 2020 - ótica da receita

Fonte de Financiamento	Enquadramento no artigo 3.º da LPIEFSS	Previsão Inicial	Receita Cobrada Líquida (1)	Pagamentos* (2)	Saldo (1) - (2)
111-RG não afetas a projetos cofinanciados	a) Receitas Gerais OE	69 560 688	24 677 041	24 677 041	0
121- Saldos de Receitas Próprias	g) Saldos de RP de 2019	0	33 858 887	1 097 838	32 761 049
123-RP do ano com possibilidade de transição	f) Alienação/rentabilização de imóveis	1 950 000	0	0	0
129-Transferências de RP entre Organismos	b) Coimas por infrações rodoviárias das FSS c) Coimas por infrações rodoviárias da ANSR d) Taxa de segurança aeroportuária e) Fundo de Garantia Automóvel f) Receita de Alienação de Imóveis g) Outras receitas	27 939 335	10 921 949	7 953 573	2 968 376
	Total	99 450 023	69 457 876	33 728 451	35 729 425

*Engloba apenas pagamentos. As Transferências para as FSS no valor de 143.391 € não foram consideradas.

O montante de receita a arrecadar, inclui cerca de 33,8 milhões de euros referentes ao saldo da gerência de 2019, apurados nas fontes de financiamento 121-Saldos de receitas próprias transitados, dos quais, cerca de 31 milhões dizem respeito ao saldo transitado na medida infraestruturas.

4.2. Ótica da Despesa

A execução orçamental da LPIEFSS, até 30 de junho de 2020, incorpora os ajustamentos, na dotação inicial definida na LPIEFSS, decorrentes da aplicação de cativos e da integração dos saldos apurados na gerência anterior, conforme se pode verificar no quadro seguinte.

Quadro 7 - Resumo da execução orçamental da LPIEFSS, até 30 de junho de 2020

(um: EUR)

Descrição	Valor
Dotação Inicial (1)	99 450 023
Saldos transitados (2)	33 858 887
Crédito Especial de RP (3)	0
Transferências para as FSS (4)	143 391
Dotação Corrigida (5) = (1) + (2) + (3) - (4)	133 165 519
Cativo (6)	9 211 705
Dotação corrigida líquida (7) = (5) - (6)	123 953 814
Pagamentos (8)	33 728 451
Saldo das medidas (9) = (7) - (8)	90 225 363

A perspetiva macro e ampla fornecida pelo Quadro 7, é complementada pelo detalhe do Quadro 8 que evidência a execução orçamental de cada medida, com destaque para as medidas STIC e Veículos que pelas suas características plurianuais tornam a execução fluída e financeiramente previsível.

Quadro 8 - Resumo da execução orçamental por medidas da LPIEFSS, até 30 de junho de 2020

(um: EUR)

Descrição	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	23 426 425	15 400 000	1 050 000	1 280 000	1 000 000	3 728 493	53 565 105	99 450 023
Saldos da Gerência Anterior aplicados em despesa (2)	31 050 559		2 226 464	581 864				33 858 887
Reforços da LPIEFSS - Dotação Centralizada combate a incêndios e projeto Cadernos Eleitorais e projeto Modernização da SGMAI (3)								0
Crédito Especial de RP (4)	0							0
Transferências para as FSS (5)	143 391							143 391
Alterações orçamentais entre medidas (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotação Corrigida (7) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) + (6)	54 333 593	15 400 000	3 276 464	1 861 864	1 000 000	3 728 493	53 565 105	133 165 519
Cativo (8)	0	1 925 000	0	0	125 000	466 062	6 695 643	9 211 705
Dotação corrigida líquida (9) = (7) - (8)	54 333 593	13 475 000	3 276 464	1 861 864	875 000	3 262 431,0	46 869 462	123 953 814
Pagamentos (10)	1 649 301	8 520 681	98 016	795 269	71 014	0	22 594 171	33 728 451
Saldo da medida (11) = (9) - (10)	52 684 292	4 954 319	3 178 448	1 066 595	803 986	3 262 431	24 275 291	90 225 363
Execução financeira (12) = (10) + (5)	1 792 692	8 520 681	98 016	795 269	71 014	0	22 594 171	33 871 842

Quadro 9 - Posição orçamental por medida LPIEFSS - até 30 de junho de 2020

Medida	Dotação Corrigida Líquida	Cabimentos	% Cabimentos	Compromissos	% Compromissos	Pagamentos	% Pagamentos
Infraestruturas	54 333 593 €	22 351 997 €	41,14%	15 755 109 €	29,00%	1 649 301 €	3,04%
Veículos	13 475 000 €	11 075 677 €	82,19%	11 075 677 €	82,19%	8 520 681 €	63,23%
Armamento	3 276 464 €	1 669 538 €	50,96%	1 449 368 €	44,24%	98 016 €	2,99%
Equipamento de Proteção Individual	1 861 864 €	1 156 262 €	62,10%	1 156 262 €	62,10%	795 269 €	42,71%
Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	875 000 €	583 122 €	66,64%	71 014 €	8,12%	71 014 €	8,12%
Equipamento para Funções Especializadas	3 262 431 €	3 654 252 €	112,01%	1 651 356 €	50,62%	0 €	0,00%
<i>Projeto 10359 – Equipamentos para as FSS</i>	<i>5 616 338 €</i>	<i>2 186 975 €</i>	<i>38,94%</i>	<i>889 306 €</i>	<i>15,83%</i>	<i>717 371 €</i>	<i>12,77%</i>
<i>Projeto 9487 - COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA</i>	<i>27 467 531 €</i>	<i>23 832 390 €</i>	<i>86,77%</i>	<i>15 566 665 €</i>	<i>56,67%</i>	<i>14 875 958 €</i>	<i>54,16%</i>
<i>Restantes projetos</i>	<i>13 785 593 €</i>	<i>12 470 450 €</i>	<i>90,46%</i>	<i>11 774 177 €</i>	<i>85,41%</i>	<i>7 000 843 €</i>	<i>50,78%</i>
Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação	46 869 462 €	38 489 814 €	82,12%	28 230 148 €	60,23%	22 594 171 €	48,21%
Total	123 953 814 €	78 980 661 €	63,72%	59 388 933 €	47,91%	33 728 451 €	27,21%

Conforme referido anteriormente, no decorrer do 1º semestre, foram ainda considerados pequenos acertos nos saldos de gerência anterior transitados por FSS, após análise das Fontes de Financiamento de que foram originárias, considerando a natureza não transitável de algumas delas, provocando ligeiras oscilações, face ao aprovado no Plano de Aquisições de 2020 e que se pretende retificar no presente Relatório Intercalar.

Nesse sentido e com base nas dotações disponíveis ajustadas por FSS e nas necessidades aquisitivas demonstradas, que constam do PA2020, as mesmas foram, entretanto, redefinidas, conforme se demonstra nos quadros seguintes.

Assim, os quadros infra refletem os valores transitados por cada FSS que sofreram alterações e, por sua vez, as dotações corrigidas líquidas atribuídas a cada uma, evidenciando já as alterações de necessidades ajustadas.

Quadro 10 - Detalhe das dotações da Medida Armamento por FSS

FSS	Dotação Inicial LPIEFSS	Dotação Inicial OE2020 (a)	Cativações (b)	SGA autorizados (c)	Dotação Disponível LPIEFSS (d) = (a) - (b) + (c)	Procedimentos Transitados de Anos Anteriores (e)	Saldo disponível/necessidade de reforço (f) = (d) - (e)	Levantamento de Necessidades para 2020	Saldo disponível/Necessidade de Reforço após necessidades
GNR	432 800,00	432 800,00		1 516 053,86	1 948 853,86	1 281 542,34	667 311,52	571 559,78	95 751,74
PSP	515 200,00	515 200,00		702 571,68	1 217 771,68	83 715,03	1 134 056,65	220 170,00	913 886,65
SEF	102 000,00	102 000,00		7 838,19	109 838,19	84 135,25	25 702,94	19 363,20	6 339,74
	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	2 226 463,73	3 276 463,73	1 449 392,62	1 827 071,11	811 092,98	1 015 978,13

Quadro 11 - Detalhe das dotações da Medida EAAOp por FSS

FSS	Dotação Inicial LPIEFSS	Dotação Inicial OE2020 (a)	Cativações (b)	SGA autorizados (c)	Dotação Disponível LPIEFSS (d) = (a) - (b) + (c)	Procedimentos Transitados de Anos Anteriores (e)	Saldo Disponível/necessidade de reforço (f) = (d) - (e)	Levantamento de Necessidades para 2020	Saldo Disponível/Nece ssidade Reforço após necessidades
GNR	500 000,00	500 000,00	62 500,00		437 500,00	39 004,53	398 495,47	217 600,25	180 895,22
PSP	500 000,00	500 000,00	62 500,00		437 500,00	32 009,52	405 490,48	437 500,00	-32 009,52
	1 000 000,00	1 000 000,00	125 000,00	0,00	875 000,00	71 014,05	803 985,95	655 100,25	148 885,70

Quadro 12 - Detalhe das dotações da Medida EFE por FSS

FSS	Dotação Inicial LPIEFSS	Dotação Inicial OE2020 (a)	Cativações (b)	SGA autorizados (c)	Dotação Disponível LPIEFSS (d) = (a) - (b) + (c)	Procedimentos Transitados de Anos Anteriores (e)	Saldo Disponível/necessidade de reforço (f) = (d) - (e)	Levantamento de Necessidades para 2020	Saldo Disponível/Nece ssidade Reforço após necessidades
GNR	293 000,00	1 695 918,00	69 672,00		1 626 246,00	1 651 355,65	-25 109,65		-25 109,65
PSP	1 667 000,00	2 032 575,00	396 390,00		1 636 185,00	2 002 896,27	-366 711,27	295 470,60	-662 181,87
	1 960 000,00	3 728 493,00	466 062,00	0,00	3 262 431,00	3 654 251,92	-391 820,92	295 470,60	-687 291,52

Quadro 13 - Detalhe das dotações da Medida EPI por FSS

FSS	Dotação Inicial LPIEFSS	Dotação Inicial OE2020 (a)	Cativações (b)	SGA autorizados (c)	Dotação Disponível LPIEFSS (d) = (a) - (b) + (c)	Procedimentos Transitados de Anos Anteriores (e)	Saldo disponível/necessidade de reforço (f) = (d) - (e)	Levantamento de Necessidades para 2020	Saldo disponível/Necessidade Reforço após necessidades
GNR	501 849,74	501 849,74		53 005,76	554 855,50	792 261,45	-237 405,95	128 520,00	-365 925,95
PSP	725 150,26	725 150,26		473 821,68	1 198 971,94	364 000,05	834 971,89	1 251 617,25	-416 645,36
SEF	53 000,00	53 000,00		55 037,00	108 037,00		108 037,00	163 479,00	-54 442,00
	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	581 864,44	1 861 864,44	1 156 261,50	705 602,94	1 543 616,25	-837 013,31

Quanto à medida STIC, por não terem sido indicados os valores dos procedimentos transitados do ano anterior, no PA2020 importa corrigir essa ausência através do quadro seguinte, redefinindo entre outros aspetos as necessidades de reforço.

Quadro 14 - Detalhe das dotações da Medida STIC por Beneficiário.

FSS	Dotação Inicial LPIEFSS	Dotação Inicial OE2020 (a)	Cativações (b)	SGA (c)	Dotação Disponível LPIEFSS (d) = (a) - (b) + (c)	Procedimentos Transitados de Anos Anteriores (e)	Saldo disponível/necessidade de reforço (f) = (d) - (e)	Levantamento de Necessidades para 2020	Saldo disponível/Necessidade Reforço após necessidades
GNR	3 358 000,00	3 358 000,00	419 750,00		2 938 250,00	338 687,96	2 599 571,04	2 938 224,00	-338 652,96
PSP	3 091 200,00	3 091 200,00	386 400,00		2 704 800,00	359 012,40	2 345 787,60	2 739 763,50	-393 975,90
SEF	10 800,00	10 800,00	1 350,00		9 450,00		9 450,00		9 450,00
SG MAI	40 295 060,00	47 105 105,00	5 888 138,00	0	41 216 967,00	40 725 159,00	491 808,00	5 941 906,42	-5 450 098,42
	46 755 060,00	53 565 105,00	6 695 638,00	0	46 869 467,00	41 422 859,36	5 446 616,64	11 619 893,92	-6 173 277,28

Através do quadro seguinte, pretende-se ilustrar os indicadores de execução orçamental da LPIEFSS, até 30 de junho de 2020 e concomitantemente, o panorama atualizado das dotações que foram consideradas, nos pagamentos, relacionadas com o investimento realizado no âmbito da LPIEFSS, num espectro global.

Os pagamentos efetuados, até 30 de junho, não refletem a maior parcela dos procedimentos aquisitivos promovidos e a promover no âmbito da LPIEFSS no presente ano, atentos os extensos prazos de entrega dos bens e serviços a adquirir, bem como a aprovação apenas em maio do presente ano do Plano de Aquisições, devido a diversas vicissitudes, que contraiu o período necessário à tramitação procedimental.

Quadro 15 – Indicadores de Execução Financeira em 2020

(um: EUR)

Medida	Mapa de Programação 2020 (1)	Execução Financeira 2020* (2)	% de Execução 2020 (2) / (1)
Infraestruturas	23 476 425	1 792 692	8%
Veículos	15 400 000	8 520 681	55%
Armamento	1 050 000	98 016	9%
Equipamento de Proteção Individual	1 280 000	795 269	62%
Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	1 000 000	71 014	7%
Equipamento para Funções Especializadas	1 960 000	0	0%
Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação	46 755 060	22 594 171	48%
Total	90 921 485	33 871 842	37%

*A execução de 2020 engloba os pagamentos da SGA e as transferências para as FSS.

Algumas medidas pelo seu caráter plurianual permitem uma execução material e financeira nos anos subsequentes à sua contratação elevada, conforme se pode verificar na medida Veículos, devido a toda a tramitação pré-contratual ser bastante burocrática e complexa.

5. Indicadores de Execução Material

Por forma a evidenciar a execução material da LPIEFSS foram definidos um conjunto de indicadores de execução, materialmente quantificáveis:

Quadro 16 – Indicadores de Execução Material

(um: EUR)

Medida	Necessidades aquisitivas para 2020 (1)	Execução material até 30 de junho 2020 (2)	% de Execução 2020 (2) / (1)
Veículos	583	417	71,53%
Armamento	6 145	3 055	49,72%
Equipamento de Proteção Individual	17 285	3 473	20%
Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	4 363	475	10,89%
Equipamento para Funções Especializadas	794	57	7,18%
Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação*	16 606	167	1,01%
Total	45 776	7 644	16,70%

*Apenas engloba os dados do Projeto 10359

O quadro acima evidencia a execução material esperada e já cumprida no corrente ano, quer tenha transitado de anos anteriores ou constitua a entrega de bens planeada no presente ano.

A execução material das medidas Veículos, Armamento, EPI, EAAOp e EFE é apurada pelo número de bens entregues e a entregar às FSS em 2020.

Na medida STIC, devido às suas especificidades e diversidade de projetos para efeitos de execução material, o presente relatório apenas irá apresentar os indicadores correspondentes ao projeto 10359 – Equipamentos para as FSS.

Relativamente à execução material e financeira da medida Infraestruturas foi tido em conta o grau de execução dos contratos, por essa razão não foi incluído no Quadro 15.

5.1. Medida - Infraestruturas

A medida Infraestruturas considerada de importância estrutural para a atividade das FS, visa rentabilizar as instalações mais degradadas, construir novas instalações e melhorar os espaços afetos às Forças de Segurança, bem como identificar imóveis suscetíveis de rentabilização, otimizando soluções.

O Quadro imediatamente abaixo dá-nos a realidade do panorama de empreitadas e serviços tramitados pela SGMAI, nas fases de execução ou contratação, de acordo com as PABS remetidas pelas FSS até ao final do 1.º semestre do ano.

Na coluna observações é possível verificar a informação do estado de cada procedimento, sendo que a ausência de informação se traduz na sua execução material e financeira à data.

Quadro 17 – Situação dos procedimentos da Medida Infraestruturas

FSS	Descrição	Designação	Proc. Nº	Contrato C/IVA	Pagamento s anos anteriores (c/ IVA)	Valor previsto no PA 2020	Pagamento s 2020 (c/ IVA)	Total Pagamento s	Saldo	Grau de Execução do Contrato	Obs
	6-Posto Territorial de Cucujães	Projeto	70/DSUMC/17	23 247,00 €	20 922,30 €	2 323,70 €	-	20 922,30 €	2 324,70 €	90,00%	
	10-Posto Territorial Alvito	Projeto	124/DSUMC/17	33 210,00 €	9 963,00 €	24 508,98 €	-	9 963,00 €	23 247,00 €	30,00%	
	11-Posto Territorial de Barrancos	Fiscalização e CSO	10/DPIE/2019	28 290,00 €	5 535,00 €	16 878,80 €	16 678,80	22 213,80 €	6 076,20 €	78,52%	
Empreitada		119/DPIE/2018	307 273,42 €	33 837,91 €	286 797,36 €	248 003,48	281 841,39 €	25 432,03 €	91,72%		
Complementares		30/DPIE/2020	1 771,20 €		0,00 €	1 771,20	1 771,20 €	0,00 €	100,00%		
	15-Posto Territorial de Serpa	Complementares	44/DPIE/2020	3 676,32 €		0,00 €		0,00 €	3 676,32 €	0,00%	
		Fiscalização e CSO	10/DPIE/2019	26 383,50 €	7 915,05 €	18 468,45 €	18 468,45	26 383,50 €	0,00 €	100,00%	
	33-Posto Territorial Alpedrinha	Empreitada	115/DPIE/2018	828 585,20 €	126 696,13 €	741 075,62 €	308 965,45	435 661,58 €	392 923,62 €	52,58%	
		Projeto	135/DPIE/2018	5 879,40 €	5 291,46 €	0,00 €		5 291,46 €	587,94 €	90,00%	
	42-Posto Territorial de Borba	Empreitada	62/DPIE/2019	-		273 368,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%	
		Projeto	8/DPIE/2018	5 904,00 €	5 313,60 €	590,40 €		5 313,60 €	590,40 €	90,00%	
	45-Posto Territorial Viana do Alentejo	Projeto	43/DPIE/2019	15 990,00 €		15 990,00 €	4 797,00	4 797,00 €	11 193,00 €	30,00%	
	48-Posto Territorial de Aljezur	Projeto	9/DPIE/2019	31 279,76 €		28 151,78 €	-	0,00 €	31 279,76 €	0,00%	
	54-Posto Territorial Figueira de Castelo Rodrigo	Projeto	9/DPIE/2019	14 440,20 €		12 996,18 €	4 332,06	4 332,06 €	10 108,14 €	30,00%	
	93-USHE - Quartel da Ajuda	Projeto	50/DSUMC/17	54 796,49 €	24 354,00 €	36 530,99 €		24 354,00 €	30 442,49 €	44,44%	
GNR	128-Posto Territorial Alcanena	Projeto	58/DSUMC/16	11 392,88 €	10 253,59 €	1 139,00 €		10 253,59 €	1 139,29 €	90,00%	
	129-Posto Territorial Aljarça	Projeto	136/DPIE/2018	18 395,46 €		18 395,46 €		0,00 €	18 395,46 €	0,00%	
	131-Destacamento Territorial de Conuche	Projeto	13/DPIE/2018	18 958,58 €	5 687,57 €	11 375,15 €		5 687,57 €	13 271,01 €	30,00%	
	133-Posto Territorial de Salvaterra de Magos	Empreitada	4/DPIE/2018	789 842,61 €	455 921,97 €	379 016,66 €	333 920,64	789 842,61 €	0,00 €	100,00%	
		Fiscalização e CSO	117/DPIE/2018	32 373,60 €	29 136,24 €	8 848,78 €	3 237,36	32 373,60 €	0,00 €	100,00%	
		Complementares	28/DPIE/2019	75 707,99 €	75 707,99 €	97 618,23 €	37 618,23	113 326,22 €	-37 618,23 €	149,69%	
		Complementares	40/DPIE/2020	1 426,80 €		0,00 €		0,00 €	1 426,80 €	0,00%	
	140-Posto Territorial Moita	Projeto	136/DPIE/2018	21 306,71 €		21 306,71 €		0,00 €	21 306,71 €	0,00%	
	142-Posto Territorial Santo André	Projeto	9/DPIE/2019	10 983,90 €		9 885,51 €	3 295,17	3 295,17 €	7 688,73 €	30,00%	
	187-Posto Territorial de Monte Gordo	Projeto	9/DPIE/2019	18 105,60 €		16 295,04 €		0,00 €	18 105,60 €	0,00%	
	206-Posto Territorial de Avintes	Projeto	36/DPIE/2019	13 530,00 €		13 530,00 €	4 059,00	4 059,00 €	9 471,00 €	30,00%	
	222-Posto Territorial de Soure	Empreitada	GNR 4/DRL/DA/2019			152 643,00 €		0,00 €	0,00 €		
	225-Centro de Formação de Figueira da Foz - Lote 2	Empreitada	21/DPIE/2019	276 627,00 €	147 395,60 €	129 231,40 €	101 901,00	249 296,60 €	27 330,40 €	90,12%	
		Complementares	43/DPIE/2020	43 172,04 €		0,00 €		0,00 €	43 172,04 €	0,00%	

FSS	Descrição	Designação	Proc. Nº	Contrato C/IVA	Pagamento s anos anteriores (c/ IVA)	Valor previsto no PA 2020	Pagamentos 2020 (c/ IVA)	Total Pagamentos	Saldo	Grau de Execução do Contrato	Obs
GNR	233-Instalações e Equipamentos Elétricos do Heliponto de Alfândega da Fé para o GIPS	Fiscalização e CSO	41/DPIE/2019	10 147,50 €		10 147,50 €	4 059,00	4 059,00 €	6 088,50 €	40,00%	
		Empreitada	42/DPIE/2019	90 990,55 €		90 900,55 €	78 412,94	78 412,94 €	12 577,61 €	86,18%	
	237-Instalações do GIPS Bragança	Empreitada	40/DPIE/2019	92 135,07 €	3 572,17 €	92 135,07 €	3 572,17	7 144,34 €	84 990,73 €	7,75%	
		Fiscalização e CSO	41/DPIE/2019	5 719,50 €		5 719,50 €	3 431,70	3 431,70 €	2 287,80 €	60,00%	
	238-Clinica Veterinário de Canideos	Projeto	61/DPIE/2019			39 655,48 €		0,00 €	0,00 €		Em contratação
	Posto Territorial de Lever	Revisão de Preços	53/DPIE/2018	6 096,32 €				0,00 €	6 096,32 €	0,00%	
	203 - Destacamento Territorial de Almada	Projeto	25/DPIE/2020			46 357,84 €					Em contratação
	Assistência Técnica a 65 Torres Vigilância	Serviços	17/DPIE/2020			90 712,50 €					Em contratação
	Posto Territorial de Peniche	Empreitada	64/DPIE/2019			115 312,50 €					Em contratação
	4.ª Esquadra da Ajuda	Empreitada	23/DPIE/2020			676 500,00 €					Em contratação
	Destacamento Ação Fiscal do Porto	Empreitada	39/DPIE/2020			122 367,92 €					Em contratação
	Centro de Formação de Portalegre - assessoria	Serviços	22/DPIE/2020			3 690,00 €					Em contratação
	Posto Territorial da Costa da Caparica	Empreitada	16/DPIE/2020			172 200,00 €					Em contratação
	Serviços de Análise de Projetos de Execução - Instalações PSP e GNR	Projeto	12/DPIE/2019	87 330,00 €	8 672,00 €	49 257,19 €		8 672,00 €	78 658,00 €	9,93%	
		Total GNR		3 004 968,60€	976 175,58€	3 721 921,25€	1 176 523,65€	2 152 699,22€	852 269,38 €		
PSP	21-Esquadra de Vila Nova de Fomalção (2.ª Fase)	Projeto	13/DPIE/2018	16 974,00 €	5 092,20	11 881,80		5 092,20	11 881,80	30,00%	
	40-Divisão Policial da Figueira da Foz	Projeto	10/DPIE/2018	39 882,75 €	11 964,83	27 917,92		11 964,83	27 917,93	30,00%	
	52-Esquadra de Vila Real de Santo António	Projeto	134/DPIE/2018	13 976,54 €	12 578,89			12 578,89	1 397,65	90,00%	
		Empreitada	47/DPIE/2019			179 400,00		-	-		Em contratação
	72-3.ª Divisão/20.ª Esquadra de Benfca	Empreitada	31/DPIE/2020			296 759,70					Em contratação
		Fiscalização e CSO	37/DPIE/2019			48 750,00		-	-		
	73-4.ª Divisão/ESPolicia (ISCPSI) Antigo Salão Nobre	Empreitada	35/DPIE/2019			184 500,00		-	-		Em contratação
	Projeto	145/DSUMC/2017	21 525,00 €	19 372,50	2 152,50		19 372,50	2 152,50	90,00%		
74-4.ª Divisão/Divisão de Investigação Criminal [Edifício da APL]	Projeto	10/DPIE/2018	29 520,00 €	8 856,00	29 520,00		8 856,00	20 664,00	30,00%		
75-5.ª Divisão/11.ª Esquadra e EIPP (Alto do Pina)	Projeto	144/DSUMC/17	28 290,00 €	8 487,00	19 803,00		8 487,00	19 803,00	30,00%		
82-DM/Instalações Rua José Estevão, N.º 135	Projeto	8/DPIE/2018	43 050,00 €		30 135,00		-	43 050,00	0,00%		

FSS	Descrição	Designação	Proc. Nº	Contrato C/IVA	Pagamento s anos anteriores (c/ IVA)	Valor previsto no PA 2020	Pagamentos 2020 (c/ IVA)	Total Pagamento s	Saldo	Grau de Execução do Contrato	Obs	
PSP	85-DN/Palacete da Quinta das Águas Livres em Belas	Empreitada	6/DPIE/2018	793 596,00 €	225 495,60	568 100,40	505 786,25	731 281,85	62 314,15	92,15%		
		Fiscalização e CSO	131/DPIE/2018	12 345,26 €	7 084,80	4 132,80	3 542,40	10 627,20	1 718,06	86,08%		
		Complementares	55/DPIE/2019	23 306,59 €		23 306,59	23 306,59	23 306,59	-	100,00%		
		Complementares	55/DPIE/2019	31 979,68 €		31 979,68	31 979,68	31 979,68	0,00	100,00%		
		Complementares	27/DPIE/2020	24 065,29 €		-	24 065,29	24 065,29	-	100,00%		
		Complementares	38/DPIE/2020	64 286,04 €		-	-	-	64 286,04	0,00%		
	87-Esquadra de Marvila	Fiscalização e CSO	10/DPIE/2019	29 520,00 €	2 460,00	26 568,00		2 460,00	27 060,00	8,33%		
		Empreitada	34/DPIE/2018	1 130 985,00 €		565 492,50		-	1 130 985,00	0,00%	Suspensão	
		Projeto	41/DSUMC/2017	32 595,00 €	29 335,50	1 629,75		29 335,50	3 259,50	90,00%		
	97-DN/Oficinas Centrais - Alfragide	Projeto	35/DPIE/2018	23 714,40 €	7 114,32	16 600,08		7 114,32	16 600,08	30,00%		
	101-Unidade Especial de Polícia (Centro de Condução Avançada)	Empreitada	132/DPIE/2018			356 796,28		-	-	-		Em contratação
		Projeto	60/DSUMC/17	53 505,00 €	48 154,50	5 350,50		48 154,50	5 350,50	90,00%		
	107-Comando Distrital de Portalegre (2.ª Fase)	Projeto	8/DPIE/2018	36 838,50 €	11 051,55	25 786,95		11 051,55	25 786,95	30,00%		
	118-12.ª Esquadra de Cedofeita	Complementares	65/DPIE/2019	61 418,54 €	61 418,54	61 418,54		61 418,54	-	100,00%	Concluído	
		Revisão de Preços	01/DPIE/2018	13 566,06 €				-	13 566,06	0,00%		
	119-Comando Metropolitano do Porto	Projeto	61/DPIE/2019			110 700,00		-	-	-	Em contratação	
	121-Sede 1.ª Divisão Policial - Edifício Santa Isabel - COMETPOR	Projeto	9/DPIE/2019	46 125,00 €		41 512,50		-	46 125,00	0,00%		
	123-Divisão Policial de Vila do Conde	Projeto	8/DPIE/2018	52 767,00 €		36 936,90		-	52 767,00	0,00%		
	136-Escola Prática de Polícia (2.ª Fase)	Empreitada	11/DPIE/2019			264 634,59		-	-	-	Em contratação	
		Projeto	31/DSUMC/17	18 263,05 €	16 436,73	1 825,31		16 436,73	1 826,32	90,00%		
	137-Divisão Policial de Almada	Projeto	8/DPIE/2018	5 904,00 €	1 771,20	4 132,80		1 771,20	4 132,80	30,00%		
	143-Divisão Policial do Seixal	Serviços	04/DPIE/2020			4 305,00		-	-	-	Em contratação	
		Projeto	8/DPIE/2018	68 880,00 €	20 664,00	44 811,35		20 664,00	48 216,00	30,00%		
	144-Esquadra da Cruz de Pau	Projeto	9/DPIE/2019	11 808,00 €	3 542,40	10 627,20		3 542,40	8 265,60	30,00%		
	148-Comando Distrital de Viana do Castelo (2.ª Fase)	Empreitada	22/DPIE/2019			230 010,00		-	-	-	Em contratação	
		Fiscalização e CSO	SGMAI/UMC			24 354,00		-	-	-	A lançar	
	160-Esquadra do Corvo	Terreno				18 000,00		-	-	-		
161-Divisão Policial da Horta	Empreitada	115/DSUMC/17	98 338,50 €	94 341,00	3 998,00		94 341,00	3 997,50	95,93%			
162-Esquadra do Nordeste	Projeto	35/DPIE/2018	9 594,00 €	2 878,20	6 715,80		2 878,20	6 715,80	30,00%			
167-Esquadra de São Roque do Pico	Projeto	9/DPIE/2019	5 926,57 €		5 333,91		-	5 926,57	0,00%			
170-Divisão Policial do Machico	Terreno				1 150 000,00		-	-	-			
172-Esquadra de Porto Santo	Projeto	10/DPIE/2018	27 060,00 €		27 060,00		-	27 060,00	0,00%			
173-Esquadra da Ribeira Brava	Projeto	136/DPIE/2018	15 990,00 €		15 990,00		-	15 990,00	0,00%			
174-Esquadra de Santa Cruz	Projeto	10/DPIE/2018	12 547,12 €		12 547,12		-	12 547,12	0,00%			
195-Esquadra de Trás-os-Montes - Caxias - COMETLIS	Projeto	10/DPIE/2018	7 054,92 €	2 116,48	4 938,46		2 116,48	4 938,45	30,00%			

FSS	Descrição	Designação	Proc. Nº	Contrato C/IVA	Pagamento 5 anos anteriores (c/ IVA)	Valor previsto no PA 2020	Pagamentos 2020 (c/ IVA)	Total Pagamentos	Saldo	Grau de Execução do Contrato	Obs
	200-COMETPOR - Instalações do Viso	Projeto	15/DPIE/2018	147 600,00 €	44 280,00	130 320,00		44 280,00	103 320,00	30,00%	
	217-Esquadra de Porto Moniz	Projeto	136/DPIE/2018	7 380,00 €		7 380,00			7 380,00	0,00%	
	Empreitada de Reabilitação Do Edifício Da Divisão Policial De Elvas	Empreitada	01/DPIE/2020	258 267,81 €		276 750,00			258 267,81	0,00%	
	44-Comando Distrital de Évora	Projeto	15/DPIE/2020			105 165,00					Em contratação
	152-Divisão Policial de Chaves	Projeto	15/DPIE/2020			143 910,00					Em contratação
PSP	164-Divisão Policial de Ponta Delgada/UEP	Projeto	15/DPIE/2020			80 257,50					Em contratação
	179-Comando Distrital de Braga (2.ª Fase)	Projeto	15/DPIE/2020			166 050,00					Em contratação
	215-DN/António Augusto Aguiar - Reabilitação Geral	Projeto	15/DPIE/2020			202 950,00					Em contratação
	83-DN/Instalações Rua José Estevão, n.º 137	Empreitada	18/DPIE/2020			348 188,92					Em contratação
		Fiscalização e CSO	19/DPIE/2020			13 284,00					Em contratação
	226-Divisão Policial da Figueira da Foz	Empreitada	PSP 720/DAC/2018			143 391,24					
Total PSP				3 334 371,68	658 829,66	6 155 654,20	588 680,21	1 247 509,87	2 086 861,81		
Total Geral				6 339 340,28	1 635 005,24		1 765 203,86	3 400 209,09	2 939 131,19		

No quadro seguinte apresentam-se diversos contratos referentes à aquisição de projetos de execução contratualizados em anos anteriores a 2018, que estavam previstos encargos referentes ao pagamento de 10% com a assistência técnica da empreitada, pagos apenas após a sua conclusão e que por lapso não constam do PA2020.

Quadro 18 – Empreitadas e serviços com encargos assumidos – Informação adicional ao PA 2020

FSS	Descrição	Designação	Proc. Nº	Contrato C/IVA	Pagamentos 5 anos anteriores (c/ IVA)	Valor previsto no PA 2020	Total Pagamentos	Saldo	Grau de Execução do Contrato	Observações
PSP	DN/Instalações Rua José Estevão, N.º 137	Projeto	100/DSUMC/17	36 900,00 €	33 210,00 €	0,00 €	33 210,00 €	3 690,00 €	90,00%	Valor do saldo assumido para 2020
GNR	Posto Territorial Avis	Projeto	140/DSUMC/17	31 919,00 €	28 727,00 €	0,00 €	28 727,00 €	3 192,00 €	90,00%	Valor do saldo assumido para 2020
PSP	Divisão Policial de Matosinhos	Projeto	122/DSUMC/17	41 512,00 €	37 361,00 €	0,00 €	37 361,00 €	4 151,00 €	90,00%	Valor do saldo assumido para 2020
PSP	Esquadra de Valongo	Projeto	102/DSUMC/17	20 283,00 €	18 254,00 €	0,00 €	18 254,00 €	2 029,00 €	90,00%	Valor do saldo assumido para 2020
PSP	Comando Distrital de Viana do Castelo (1.ª Fase)	Projeto	143/DSUMC/17	30 440,00 €	27 396,00 €	0,00 €	27 396,00 €	3 044,00 €	90,00%	Valor do saldo assumido para 2020
PSP	118 - 12.ª Esquadra de Cedofeita	Projeto	27/DSUMC/15	22 140,00 €				2 140,00 €		Valor do saldo assumido para 2020

O Quadro 19 que se segue, demonstra os Contratos de Cooperação Interadministrativa celebrados entre o MAI e diversas Câmaras Municipais, traçando um cenário retrospectivo e prospetivo dos valores já pagos e dos encargos plurianuais assumidos.

Quadro 19 – Contratos Interadministrativos e escalonamento plurianual

FSS	N.º Interv.	Tipologia Protocolo/Contrato Interad.	Tipologia de Intervenção	Descrição	Objeto do Contrato	Data da Outorga	Encargos c/ IVA 2019	Encargos c/ IVA 2020	Encargos c/ IVA 2021	Encargos c/ IVA 2022	Total de Encargos (c/IVA)	Obs
GNR	151	Protocolo	Construção	Posto Territorial da GNR de Alijó	EP e PE	05-06-2019	0,00 €	92 250,00 €			92 250,00 €	
PSP	171	Protocolo	Requalificação	Esquadra da PSP da Ponta do Sol	EP e PE	17-04-2018					0,00 €	
GNR	59	Protocolo	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Alcobaça	EP e PE	20-07-2018	0,00 €	184 500,00 €			184 500,00 €	
GNR	67	Contrato Interad.	Construção	Destacamento Territorial da GNR de Alenquer	Emp e F	28-06-2017	0,00 €	1 180 643,76 €	295 160,93 €		1 475 804,69 €	
GNR	50	Contrato Interad.	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Almancil	Emp e F	11-10-2016	1 185 768,00 €	33 230,61 €	0,00 €		1 218 998,61 €	Obra concluída janeiro de 2020
PSP	138	Contrato Interad.	Requalificação	5ª Esquadra da PSP no Barreiro	Emp e F	28-06-2017	44 217,21 €	316 477,73 €	949 432,13 €	1,06 €	1 310 128,13 €	
GNR	185	Contrato Interad.	Requalificação	Posto Territorial de Lagos	Emp e F	20-11-2017		424 000,00 €			424 000,00 €	
PSP	20	Contrato Interad.	Reabilitação	Esquadra da PSP de Vila Nova de Famalicão	Emp e F	25-11-2017					0,00 €	
GNR	6	Contrato Interad.	Requalificação	Posto Territorial de Cucujães	Emp e F	07-12-2018	70 878,22 €	619 121,77 €			689 999,99 €	
PSP	122	Contrato Interad.	Requalificação	Esquadra da PSP de Valongo	Emp e F	13-12-2018	0,00 €	898 904,00 €	1,00 €		898 905,00 €	
GNR	26	Contrato Interad.	Reabilitação	Posto Territorial da GNR de Macedo de Cavaleiros	Emp e F	11-01-2019	0,00 €	700 448,00 €	0,00 €		700 448,00 €	
PSP	124	Contrato Interad.	Reabilitação	Divisão Policial da PSP de Vila Nova de Gaia	Emp e F	15-02-2019	0,00 €	132 500,00 €	0,00 €		132 500,00 €	
PSP	123	Contrato Interad.	Construção	Divisão Policial da PSP de Vila do Conde	Emp e F	16-07-2019		1 976 555,00 €	847 095,00 €		2 823 650,00 €	
GNR	235	Contrato Interad.	Remodelação	Posto Territorial da GNR de Mondim de Basto	Emp e F	01-08-2019	0,00 €	295 996,00 €	1,00 €		295 997,00 €	
GNR	236	Contrato Interad.	Recuperação	Carreira de Tiro de Macedo de Cavaleiros	Emp e F	01-08-2019	0,00 €	107 812,00 €	0,00 €		107 812,00 €	
GNR	193	Contrato Interad.	Reabilitação	Posto Territorial da GNR de Malveira	Emp e F	26-07-2019	0,00 €	125 490,00 €			125 490,00 €	Aguarda autorização PEE
GNR	194	Contrato Interad.	Reabilitação	Posto Territorial da GNR do Livramento	Emp e F	26-07-2019	0,00 €	563 895,62 €	241 669,59 €		805 565,21 €	
PSP	116	Contrato Interad.	Reabilitação	Divisão Policial da PSP de Matosinhos	Emp e F	31-07-2019		861 000,00 €	246 000,00 €		1 107 000,00 €	
GNR	113	Contrato Interad.	Remodelação	Posto Territorial da GNR de Medas	Emp e F	16-07-2019		1 017 953,69 €	1,00 €		1 017 954,69 €	
GNR	63	Contrato Interad.	Construção	Posto Territorial da GNR de Óbidos	Emp e F	29-07-2019		896 350,00 €	384 150,00 €		1 280 500,00 €	
PSP	51	Contrato Interad.	Requalificação	Divisão Policial da PSP de Portimão	Emp e F	01-08-2019		1 729 643,01 €	1,00 €		1 729 644,01 €	
GNR	2	Contrato Interad.	Reabilitação	Destacamento Territorial da GNR da Anadia	Emp e F	19-02-2020		274 661,00 €	823 981,00 €	2,00 €	1 098 644,00 €	
GNR	211	Contrato Interad.	Recuperação	Posto Territorial da GNR de Sever do Vouga	Emp e F			197 330,67 €	394 659,34 €	1,99 €	591 992,00 €	
GNR	248	Contrato Interad.	Construção	Posto Territorial da GNR de Mesão Frio	Emp e F			307 500,00 €			307 500,00 €	
GNR	104	Contrato Interad.	Construção	Posto Territorial da GNR de Avis	Emp e F	27-02-2020		285 299,73 €	784 572,28 €	1,99 €	1 069 874,00 €	
GNR	35	Contrato Interad.	Construção	Posto Territorial da GNR de Vila Velha de Rodão	Emp e F			247 775,00 €	495 549,00 €	1,00 €	743 325,00 €	Aguarda autorização PEE
GNR	7	Protocolo	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Oliveira do Bairro	EP e PE	09-03-2020		61 500,00 €			61 500,00 €	
GNR	42	Contrato Interad.	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Borba	Emp e F			97 178,00 €	883 455,71 €	2,29 €	980 636,00 €	Aguarda autorização PEE
GNR	32	Contrato Interad.	Requalificação	Posto Territorial da GNR do Fundão	Emp e F			141 333,33 €	706 665,61 €	1,06 €	848 000,00 €	Aguarda autorização PEE
							1 300 863,43 €	13 677 098,92 €	7 052 394,59 €	11,39 €	22 030 368,33 €	

* EP e PE - Estudo Prévio e Projeto de Execução
EMP e F - Empreitada e Fiscalização

Encontram-se ainda em execução Protocolos de Colaboração com diversas Câmaras Municipais com vista à celebração de Contratos Interadministrativos, conforme o quadro seguinte:

Quadro 20 - Protocolos de colaboração celebrados com vista à celebração de contratos interadministrativos

FSS	Nº Intervenção	Tipologia de Intervenção	Descrição	Objeto do Contrato	Data Outorga
PSP	157	Construção	Comando Distrital da PSP em Vila Real	Estudo Prévio e Projeto de Execução	21-04-2017
PSP	166	Requalificação	Esquadra da PSP da Ribeira Grande	Estudo Prévio e Projeto de Execução	09-11-2017
GNR	129	Construção	Posto Territorial da GNR de Alpiarça	Estudo Prévio e Projeto de Execução	15-05-2018
GNR	19	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Lordelo	Estudo Prévio e Projeto de Execução	01-06-2018
GNR	18	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Caldas das Taipas	Estudo Prévio e Projeto de Execução	01-06-2018
GNR	48	Terreno	Posto Territorial e o Sub-Destacamento de Controlo Costeiro da GNR de Aljezur	Cedência de terreno	20-06-2018
GNR	10	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Alvito	Estudo Prévio e Projeto de Execução	01-08-2018
GNR	45	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Viana do Alentejo	Estudo Prévio e Projeto de Execução	01-08-2018
GNR	47	Construção	Posto Territorial da GNR em Olhos de Água	Estudo Prévio e Projeto de Execução	07-09-2018
GNR	28	Reabilitação	Posto Territorial da GNR de Vimioso	Estudo Prévio e Projeto de Execução	30-10-2018
GNR	186	Construção	Comando Territorial da GNR de Faro	Estudo Prévio e Projeto de Execução	09-11-2018
PSP	96	Construção	Divisão Policial da PSP de Odivelas	Estudo Prévio e Projeto de Execução	19-11-2018
GNR	103	Requalificação	Centro de Formação e Comando Territorial da GNR de Portalegre	Cedência de Espaço	14-12-2018
PSP	132	Construção	Esquadra da PSP do Entrocamento	Estudo Prévio e Projeto de Execução	11-01-2019
GNR	126	Remodelação	Posto Territorial da GNR dos Carvalhos	Estudo Prévio e Projeto de Execução	15-02-2019
GNR	204	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Vila Nova de Paiva	Estudo Prévio e Projeto de Execução	15-02-2019
GNR	54	Reabilitação	Posto Territorial da GNR de Figueira de Castelo Rodrigo	Cedência de imóvel e empreitada	01-07-2019
GNR	53	Reabilitação	Destacamento e Posto Territorial da GNR de Vilar Formoso	Estudo Prévio e Projeto de Execução	05-08-2019
GNR	30	Requalificação	Posto Territorial da GNR de Paul	Estudo Prévio e Projeto de Execução	05-08-2019
GNR	30	Requalificação	Centro de Meios Aéreos do GIPS da GNR de Fafe	Estudo Prévio e Projeto de Execução	20-09-2019
GNR	251	Remodelação	Posto Territorial da GNR de Unhais da Serra	Estudo Prévio e Projeto de Execução	13-03-2020
GNR	249	Construção	Posto Territorial da GNR de Cesar	Estudo Prévio e Projeto de Execução	17-03-2020
GNR	27	Construção	Posto Territorial da GNR de Argozelo	Estudo Prévio e Projeto de Execução	19-03-2020
GNR	34	Construção	Posto Territorial da GNR da Quinta do Conde	Estudo Prévio e Projeto de Execução	23-03-2020
GNR	31	Construção	Posto Territorial da GNR de Tortosendo	Estudo Prévio e Projeto de Execução	03-04-2020
GNR	155	Remodelação	Posto Territorial da GNR de Murça	Estudo Prévio e Projeto de Execução	06-04-2020
GNR	125	Construção	Posto Territorial da GNR de Arcozelo	Estudo Prévio e Projeto de Execução	16-04-2020
PSP	124	Reabilitação	Divisão Policial de Gaia (Oliveira do Douro) - 2.ª fase	Estudo Prévio e Projeto de Execução	16-04-2020
GNR	141	Construção	Posto Territorial da GNR de Poceirão	Estudo Prévio e Projeto de Execução	23-04-2020
GNR	112	Remodelação	Posto Territorial da GNR de Fânzeres	Estudo Prévio e Projeto de Execução	14-05-2020
GNR	153	Remodelação	Posto Territorial da GNR de Montalegre	Estudo Prévio e Projeto de Execução	26-05-2020
GNR	57	Reabilitação	Posto Territorial da GNR de Seia	Estudo Prévio e Projeto de Execução	02-06-2020
GNR	158	Reabilitação	Posto Territorial da GNR de Cinfães	Estudo Prévio e Projeto de Execução	05-06-2020
PSP	114	Construção	Divisão Policial da PSP da Maia	Estudo Prévio e Projeto de Execução	09-06-2020

Nos quadros seguintes apresentam-se ainda necessidades aquisitivas no âmbito da medida infraestruturas identificadas no PA2020, mas que ainda não estão em fase de execução.

Quadro 21 – Empreitadas e serviços conexos em fase de lançamento-GNR

FSS	Descrição	Designação	Plurianual	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
	13-Comando Territorial de Beja	Empreitada	Sim	-	
	17-Comando Territorial de Braga	Empreitada	Sim	-	
	25-Posto Territorial Carrazeda de Ansiães	Projeto	Sim	30 750,00	
	76-CG/GNR - Quartel do Carmo (Edifício)	Empreitada	Sim	72 939,00	
	92-UNT - Quartel do Conde Lippe na Calçada da Ajuda	Empreitada	Sim	203 811,00	
	104-Posto Territorial Avis	Fiscalização e CSO	Sim	20 073,60	
	130-Posto Territorial Benavente	Empreitada	Sim	-	Estudo de viabilidade da solução
		Projeto	Sim	-	
	158-Posto Territorial Cinfães	Projeto	Sim	7 380,00	
	203-Destacamento Intervenção Almada	Projeto	Sim	46 357,84	
	241-Subdestacamento Territorial de Sintra	Empreitada	Sim	81 820,34	
	Reabilitação 2 Esquadrão Do Quartel da Ajuda	Empreitada	Sim	100 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação 4 Esquadrão Do Quartel da Ajuda	Empreitada	Sim	244 291,67	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Comando Territorial Santarém	Empreitada	Sim	240 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Destacamento Ação Fiscal do Lisboa	Empreitada	Sim	90 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Destacamento Ação Fiscal do Porto	Empreitada	Sim	122 367,92	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Destacamento Territorial Guimarães	Empreitada	Sim	40 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação do Posto Territorial de Paio Pires	Empreitada	Sim	80 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Posto Territorial Albergaria a Velha	Empreitada	Sim	80 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Posto Territorial Arganil	Empreitada	Sim	100 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Posto Territorial Vila do Conde	Empreitada	Sim	60 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Reabilitação Posto Territorial Vieira de Leiria	Empreitada	Sim	80 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Remodelação Centro de Formação de Portalegre	Empreitada	Sim	125 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela GNR em 2019
	Remodelação de Balneário/vestiário de Sargentos e Casa da Guarda do Quartel dos Barbadinhos	Projeto		184 722,22	
	Posto Territorial de Alfandega da Fé	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Reabilitação do Posto Territorial de Cebolais de Cima	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Escola da Guarda da Figueira da Foz	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Posto Territorial de Freamunde	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Comando Territorial da Guarda	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Comando Territorial de Leiria e CDOS de Leiria	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Comando Territorial de Lisboa, DTER Sintra e Destacamento Iml	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Posto Territorial Pedrogão Grande	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Comando Territorial Ponta Delgada	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Posto Territorial de S. Martinho do Porto	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Posto Territorial de Taveiro	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Posto Territorial da Trofa	Projeto		-	S/ encargos previstos em 2020
	Total GNR			2 009 513,59	

Quadro 22 – Empreitadas e serviços conexos em fase de lançamento-PSP

FSS	Descrição	Designação	Plurianual	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
	21-Esquadra de Vila Nova de Famalicão (2.ª Fase)	Fiscalização e CSO	Sim	-	
	36-2.ª Esquadra de Coimbra	Empreitada	Sim	430 500,00	
	37-Comando Distrital de Coimbra	Projeto	Sim	49 200,00	
	40-Divisão Policial da Figueira da Foz	Empreitada	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
		Fiscalização e CSO	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
	44-Comando Distrital de Évora	Projeto	Sim	105 165,00	Proc. 15/DPIE/2020
	52-Esquadra de Vila Real de Santo António	Fiscalização e CSO	Sim	37 500,00	
		Fiscalização e CSO	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
	61-Comando Distrital de Leiria	Projeto	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
		Empreitada	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
	72-3.ª Divisão/20.ª Esquadra de Benfca	Empreitada	Sim	296 759,70	
	73-4.ª Divisão/ESPólicia (ISCPSI) Antigo Salão Nobre	Fiscalização e CSO	Sim	37 500,00	
		Empreitada	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
	74-4.ª Divisão/Divisão de Investigação Criminal (Edifício da API)	Fiscalização e CSO	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
		Empreitada	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
	75-5.ª Divisão/11.ª Esquadra e EIFP (Alto do Pina)	Fiscalização e CSO	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
		Empreitada	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
	82-DN/Instalações Rua José Estevão, N.º 135	Fiscalização e CSO	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
		Empreitada	Sim	348 188,92	
	83-DN/Instalações Rua José Estevão, N.º 137	Fiscalização e CSO	Sim	13 284,00	
	87-Esquadra de Marvila (adaptação projecto execução)	Projeto	Sim	24 600,00	
		Empreitada	Sim	-	
	88-Esquadra de São Domingos de Benfca	Fiscalização e CSO	Sim	-	
		Empreitada	Sim	400 000,00	
	95-Divisão Policial de Loures/76.ª Esquadra	Fiscalização e CSO	Sim	37 500,00	
		Empreitada	Sim	153 750,00	
	97-DN/Oficinas Centrais - Alfragide	Fiscalização e CSO	Sim	4 428,00	
	99-Divisão Policial de Sintra	Projeto	Sim	60 000,00	
PSP	101-Unidade Especial de Policia (Centro de Condução Avançada)	Fiscalização e CSO	Sim	33 653,00	
	116-Divisão Policial de Matosinhos	Projeto	Sim	4 151,25	
	118-12.ª Esquadra de Cedofeita	Serviço	Não	1 059,30	Proc. 20/DPIE/2020
	134-Comando Distrital de Santarém	Empreitada	Sim	16 605,00	
		Projeto	Sim	-	S/ encargos previstos em 2020
	136-Escola Prática de Policia (2.ª Fase)	Fiscalização e CSO	Sim	13 284,00	
	159-Divisão Policial de Angra do Heroísmo	Projeto	Sim	73 800,00	
		Empreitada	Sim	-	
	162-Esquadra do Nordeste	Fiscalização e CSO	Sim	-	
		Empreitada	Sim	-	
	174-Esquadra de Santa Cruz	Fiscalização e CSO	Sim	-	
		Empreitada	Sim	-	
	210-Esquadra de Vila do Porto	Projeto	Sim	18 450,00	
	Comando Distrital de Setúbal	Empreitada		70 000,00	
	Divisão de Investigação Criminal do Porto	Empreitada		-	
	Divisão Policial de Lamego	Empreitada	Sim	61 500,00	Necessidade de intervenção identificada pela PSP em 2019
	Esquadra da Pontinha	Empreitada	Sim	250 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela PSP em 2019
	Esquadra de Moura	Empreitada	Sim	-	Necessidade de intervenção identificada pela PSP em 2019
	Esquadra de S. Joaquin (Açores)	Empreitada		123 000,00	
	Esquadra de Torres Novas	Empreitada	Sim	400 000,00	Necessidade de intervenção identificada pela PSP em 2019
	Divisão Policial de Lamego	Fiscalização e CSO	Sim	4 428,00	Necessidade identificada pela PSP em 2019
	Esquadra da Pontinha	Fiscalização e CSO	Sim	10 000,00	Necessidade identificada pela PSP em 2019
	Esquadra de Moura	Fiscalização e CSO	Sim	-	Necessidade identificada pela PSP em 2019
	Esquadra de Torres Novas	Fiscalização e CSO	Sim	15 000,00	Necessidade identificada pela PSP em 2019
	Divisão Policial de Aveiro (2ª Fase)	Projeto	Sim	15 000,00	Necessidade identificada pela PSP em 2019
	Esquadra da Calheta	Projeto	Sim	15 000,00	Necessidade identificada pela PSP em 2019
	Serviços de Análise de Projetos de Execução - Instalações PSP e GNR	Projeto	Sim	49 257,19	
	Unidade Especial de Policia (reabilitação edificio existente)	Projeto	Sim	30 000,00	Necessidade identificada pela PSP em 2019
	Divisão Policial de S. João da Madeira	Projeto		-	
			Total PSP	3 202 563,36	
			Total Geral	5 212 076,95	

5.2. Medida - Veículos

Com intenção de reduzir a idade média da frota das FSS, de adquirir veículos especiais, de reduzir os custos com combustíveis e de manutenção de frota e a reduzir a taxa de inoperacionalidade da frota, a LPIEFSS vem em 2020 e 2021 entregar 1167 viaturas às FSS.

Considerando a complexidade e morosidade da tramitação pré-contratual da medida veículos, a não autorização da integração de saldos de receitas próprias pelo membro do governo responsável pela área das Finanças, a necessidade de caracterização/transformação da maioria dos veículos adquiridos, bem como a atipicidade do ano de 2020, as FSS procederam à eliminação das novas necessidades aquisitivas constantes do PA2020.

Assim, a execução material e financeira da medida Veículos é resultado de procedimentos aquisitivos plurianuais, no período 2018-2021, com entregas programadas de 583 veículos em 2020, bem como dos veículos entregues ainda em 2019, mas que a execução financeira apenas ocorreu em 2020 (1 viatura), conforme o quadro seguinte:

Quadro 23 – Plano de Aquisições para 2020 – Procedimentos transitados de 2019 - Medida Veículos

FSS	Proc. nº	Designação	Plurianual	Quantidade 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo para 2020 (c/ IVA)	Data de entrega	Observações
GNR	117/DSUMC/2017	Investigação criminal	Sim	9	16 459,67	148 137,04	16-04-2020	
		Investigação criminal	Sim	8	24 267,90	194 143,20	25-03-2020	
		Patrulhamento turístico	Sim	1	40 134,62	40 134,62	31-03-2020	
		Programas especiais	Sim	10	21 906,30	219 063,00	03-04-2020	
		Posto móvel	Sim	2	35 235,26	70 470,51	16-03-2020	
		Patrulham trânsito	Sim	23	18 387,71	422 917,39	08-04-2020	
		Pronto socorro (reboque)	Sim	1	60 828,63	60 828,63	15-04-2020	
		Investigação criminal	Sim	3	20 019,79	60 059,36	11-03-2020	
		Patrulhamento trânsito	Sim	120	19 503,26	2 340 391,36		Por receber
		Canídeos	Sim	3	21 937,94	65 813,81	22-06-2020	
	Patrulhamento trânsito	Sim	27	29 608,17	799 420,49	31-03-2020		
	Patrulham territorial e trânsito	Sim	16	27 830,24	445 283,91	11-05-2020	A 11 de maio apenas foram entregues 9 viaturas	
	Lofoscopia (csi)	Sim	6	21 538,56	129 231,33		Por receber	
	Ordem pública	Sim	5	45 971,73	229 858,65		Por receber	
	Patrulhamento territorial	Sim	18	35 743,80	643 388,40	03-04-2020		
	99/DPIE/2018	Motociclos	Sim	12	8 617,21	103 406,53	19-03-2020	
		Viaturas	Sim	6	42 976,21	257 857,27	19-03-2020	
	55/DPIE/2018	Patrulhamento/Fiscalização de trânsito	Sim	9	5 063,32	45 569,88	09-06-2020	
		Serviço de estafeta	Sim	4	7 714,07	30 856,27	09-06-2020	
		Investigação criminal	Sim	12	16 707,95	200 495,41	16-04-2020	
Patrulhamento territorial		Sim	5	27 499,81	137 499,06	22-06-2020		
Transporte pessoal		Sim	2	78 597,19	157 194,37		Por receber	
		Transporte pessoal	Sim	1	224 462,70	224 462,70	16-06-2020	
Total GNR						7 026 483,19		

FSS	Proc. nº	Designação	Plurianual	Quantidade 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo para 2020 (c/ IVA)	Data de entrega	Observações
PSP		MOP	Sim	10	60 999,64	609 996,36	06-05-2020	
PSP		Inv. Criminal	Sim	24	16 955,10	406 922,28	06-04-2020	
PSP	117/DSUMC/2017	Carros Patrulha	Sim	107	18 876,28	2 019 762,08	12-05-2020	64 Veículos entregues a 27 de abril e as restantes a 12 de maio
PSP		CP Trânsito	Sim	21	21 233,67	445 907,16	20-03-2020	
PSP		Escolta/DT	Sim	12	16 975,67	203 708,08	26-02-2020	
PSP		Canídeos	Sim	3	23 390,11	70 170,33		Por receber
PSP		Transporte detidos	Sim	6	22 789,05	136 734,28		Por receber
PSP		Corpo de segurança pessoal	Sim	14	39 983,27	559 765,72	30-04-2020	
PSP		Canídeos	Sim	2	42 365,02	84 730,03	20-03-2020	
PSP	99/DPIE/2018	Motociclos	Sim	12	18 099,07	217 188,82	20-03-2020	
PSP		Patrulhamento de trânsito	Sim	13	10 078,92	131 025,90		Por receber
PSP		Patrulhamento	Sim	4	28 298,77	113 195,08		Por receber
PSP		Proteção de testemunhas	Sim	17	24 897,02	423 249,35	25-03-2020	
PSP		Transporte pessoal (TP 8)	Sim	9	32 185,85	289 672,68	23-03-2020	
PSP	55/DPIE/2018	Patrulha com proteção ballística	Sim	14	47 749,29	668 490,04	30-04-2020	
PSP		Transporte especial UEP-CIEXSS	Sim	1	58 898,55	58 898,55	30-12-2019	Veículo entregue em 2019, mas a fatura apenas foi paga em 2020
Total PSP						6 439 416,74		
SEF	117/DSUMC/2017	Investigação criminal	Sim	12	20 488,42	245 861,01	20-03-2020	
Total SEF						245 861,01		
Total Geral						13 711 760,94		

Com base nos dados constantes do quadro anterior com referência às entregas até 30 de junho, podemos verificar que já foram entregues e distribuídos 417 veículos pelas FSS, consistindo numa percentagem de execução material de 71,53%, conforme o quadro seguinte:

Quadro 24 – Indicador de execução material – Medida Veículos

Medida - Veículos	PA 2020	Execução Material	% Execução
GNR	303	163	53,80%
PSP	268	242	90,30%
SEF	12	12	100,00%
Total	583	417	71,53%

O Quadro 24 apresenta um resumo do indicador de execução material dos veículos entregues e previstos ainda entregar em 2020 com os correspondentes encargos.

Quadro 25 – Indicador de execução material dos veículos previstos entregar em 2020

Estado	FSS	Qtd	Encargos (€)
1. Veículos entregues	GNR	163	3 974 996 €
	PSP	242	5 929 393 €
	SEF	12	245 861 €
1. Veículos entregues Total		417	10 150 249 €
2. Veículos por entregar	GNR	140	3 051 487 €
	PSP	26	451 126 €
	SEF	0	0 €
2. Veículos por entregar total		166	3 502 613 €
3. Veículos em fase de contratação	GNR	0	0 €
	PSP	0	0 €
	SEF	0	0 €
3. Veículos em fase de contratação Total		0	0
Total	GNR	303	7 026 483 €
	PSP	268	6 380 518 €
	SEF	12	245 861 €
Total Geral		583	13 652 862 €

Os gráficos seguintes dão uma perspetiva auxiliar relativa à execução material e correspondentes encargos da medida Veículos, estando perto dos 100 % no que respeita à PSP e plena no que concerne ao SEF.

Quanto à GNR, a execução esperada é também de 100 %, estando em valores inferiores aos seus congéneres, uma vez que o Lote 13 do Procedimento 177/DSUMC/2017 ainda não foi entregue e que é composto por 120 viaturas, tendo uma elevada prevalência no panorama de viaturas de 2020.

Gráfico 2 – Quantidade de Veículos entregues e a entregar por FSS, em 2020





Gráfico 3 – Encargos com os Veículos entregues e a entregar por FSS, em 2020

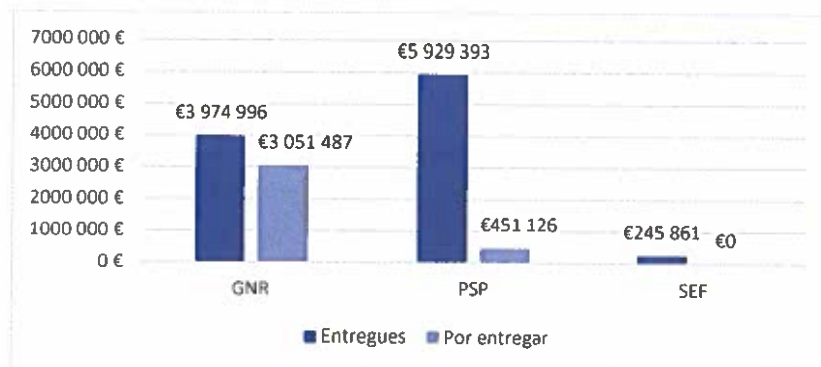

5.3. Medida - Armamento

Com o desígnio de modernizar o armamento policial através da aquisição de bens diversos, armamento para missões especiais e de sistemas de apoio ao armamento, reduzindo os custos com a sua manutenção a Medida Armamento apresenta o seguinte Quadro de execução material e encargos em 2020.

Quadro 26 – Plano de Aquisições para 2020 – Procedimentos transitados de 2019 – Medida Armamento

FSS	Proc. nº	Designação	Descrição	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Data de Entrega	Observações
GNR	04/DPIE/2019	Armas	Lote 1A - Pistola GLOCK	164	589,97	96 755,00	29-06-2020	
	34/DPIE/2019	Armas	Aplicadores de gás pimenta + 1 recarga	2220	30,09	66 790,48	20-01-2020	
	05/DPIE/2019	Acessórios	Pistola	8	693,72	5 549,76	04-03-2020	
	06/DPIE/2019	Acessórios	Lote 1 - Sistema de pontaria Laser	8	2 340,74	18 725,91	20-04-2020	
		Acessórios	Lote 2 - aplicação na espingarda	6	3 009,99	18 059,97	02-06-2020	
		Acessórios	Lote 3 - Lanterna Surefire,	7	519,99	3 639,96	04-03-2020	
	33/DPIE/2019	Armas	Item 1 - Pistola-metralhadora	20	3 897,87	77 957,40		Bens por entregar
		Armas	Item 2 - Pistola-metralhadora	90	2 388,66	214 979,40		Bens por entregar
		Armas	Item 3 - Espingarda de Assalto	4	5 429,22	21 716,88		Bens por entregar
		Armas	Item 4 - Espingarda de Precisão	2	20 836,20	41 672,40		Bens por entregar
		Armas	Item 5 - Lança granadas	6	2 734,91	16 409,43		Bens por entregar
		Armas	Item 6 - Espingarda Precisão	5	7 632,15	38 160,75		Bens por entregar
		Armas	Item 7 - Espingarda de assalto	20	4 045,47	80 909,40		Bens por entregar
		Armas	Item 8 - Espingarda HK	265	2 189,49	580 215,60	02-06-2020	
Total GNR						1 281 542,34		
PSP	53/DPIE/2019	Armas	Shotgun	70	1 029,02	72 031,26	30-01-2020	Faltam entregar 10 bolsas de transporte
		Acessórios	Acessórios	70	166,91	11 683,77		
Total PSP						83 715,03		
SEF	44/DPIE/2019	Armas	PISTOLAS GLOCK	137	589,97	80 825,82	25-06-2020	
	34/DPIE/2019	Armas	Aplicadores de gás pimenta + 1 recarga	110	30,09	3 309,43	21-01-2020	
Total SEF						84 135,25		
Total Geral						1 449 392,62		

Verifica-se nesta Medida que os procedimentos aquisitivos promovidos em 2019 sintetizam, neste momento a execução material e financeira, contudo e de acordo com as propostas de aquisição de bens e serviços remetidas pelas FSS, novos procedimentos pré-contratuais já se iniciaram e se iniciarão, durante o presente ano:

Quadro 27 – Plano de Aquisições para 2020 – Novas necessidades – Medida Armamento

FSS	Designação	Descrição	Prioridade	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
GNR	Armas	Espingarda de Assalto	1	6	5 440,00	32 640,00	
	Armas	Espingarda de Precisão	1	2	20 840,00	41 680,00	
	Armas	Lança granadas	1	2	2 740,00	5 480,00	
	Armas	Aplicadores de Gás Pimenta + 1 Recarga	1	10	35,00	350,00	
	Armas	Pistola Glock	1	474	625,97	296 709,78	
	Armas	Espingarda		80	2 190,00	175 200,00	
	Armas	Pistola-metralhadora		5	3 900,00	19 500,00	
Total GNR						571 559,78	

FSS	Designação	Descrição	Prioridade	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
PSP	Armas	Bastões extensíveis		2000	110,09	220 170,00	Proc. nº 42/DPIE/2020 - Elaboração de peças e informação de abertura
Total PSP						220 170,00	
SEF	Armas	Shotgun		4	1 194,00	4 776,00	PABS nº 13144/SEF/2020
	Armas	Coldres externos		200	51,66	10 332,00	PABS nº 13139/SEF/2020
	Armas	Coldres interiores		40	10,13	405,20	PABS nº 13140/SEF/2020
	Armas	Gás Pimenta		110	35,00	3 850,00	PABS nº 13137/SEF/2020
Total SEF						19 363,20	
Total Geral						811 092,98	

No capítulo da execução material, os quadros e gráficos infra, clarificam o posicionamento relativo de bens entregues e a entregar no cenário geral da Medida, bem como as perspectivas de bens e respetivos acessórios em fase de contratação e os encargos correspondentes.

Quadro 28 – Indicador de execução material do armamento previsto adquirir em 2020

Estado	FSS	Descrição	Qtd	Encargos (€)	
1. Armamento entregue	GNR	Armas	2 649	743 761 €	
		Acessórios	29	45 976 €	
	PSP	Armas	70	72 031 €	
		Acessórios	60	10 015 €	
	SEF	Armas	247	84 135 €	
		Acessórios	0	0 €	
1. Armamento entregue Total			3 055	955 918 €	
2. Armamento por entregar	GNR	Armas	147	491 806 €	
		Acessórios	0	0 €	
	PSP	Armas	0	0 €	
		Acessórios	10	1 669 €	
	SEF	Armas	0	0 €	
		Acessórios	0	0 €	
2. Armamento por entregar total			157	493 475 €	
3. Armamento em fase de contratação	GNR	Armas	579	571 560 €	
		Acessórios	0	0 €	
	PSP	Armas	2 000	220 170 €	
		Acessórios	0	0 €	
	SEF	Armas	354	19 363 €	
		Acessórios	0	0 €	
3. Armamento em fase de contratação Total			2 933	2 933 €	
Total	GNR	Armas	3 375	1 807 127 €	
		Acessórios	29	45 976 €	
	PSP	Armas	2 070	292 201 €	
		Acessórios	70	11 684 €	
	SEF	Armas	601	103 498 €	
		Acessórios	0	0 €	
	Total Armas		6 046	2 202 826 €	
	Total Acessórios		99	57 659 €	
	Total Geral			6 145	2 260 486 €

Gráfico 4 – Quantidade de Armas e Acessórios entregues e a entregar por FSS, em 2020


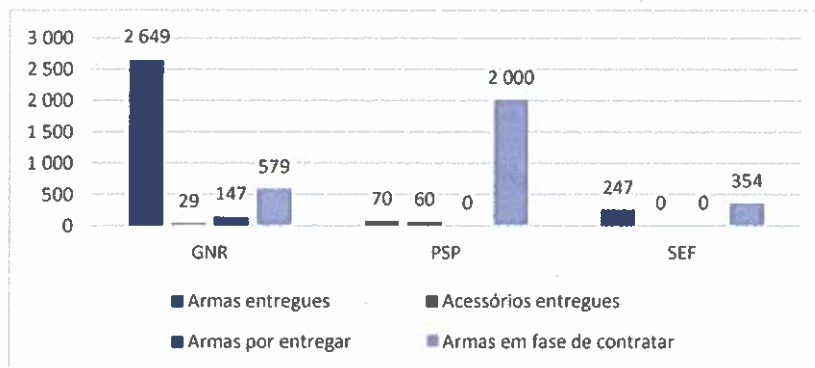


Gráfico 5 – Encargos com Armas e Acessórios entregues e a entregar por FSS, em 2020

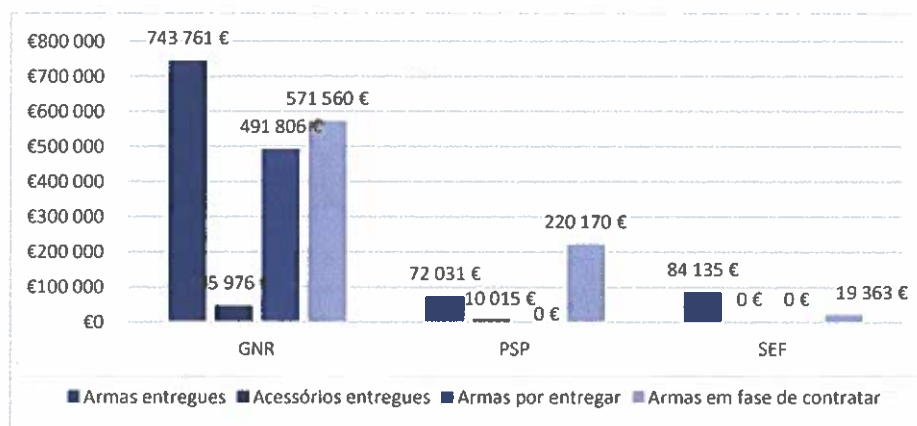

Os procedimentos iniciados e a iniciar em 2020, constantes do Quadro 27, estão ainda em fase pré-contratual, sendo expectável a entrega dos bens no presente exercício e a execução financeira na sua plenitude, de forma a evitar a perda de verba por não transição de saldos.

Até à presente data, a Medida Armamento apresenta uma execução material de cerca de 49,72%, considerando bens ainda a adquirir/em contratação.

5.4. Medida - Equipamento de Proteção Individual

A Medida EPI procura garantir a integridade física dos elementos policiais através da aquisição de coletes balísticos, equipamento de ordem pública e de outro equipamento de proteção individual.

Apresenta-se a seguir um resumo dos procedimentos aquisitivos promovidos, executados e, com respetivas quantidades contratadas e transitados do exercício anterior, no âmbito da presente medida:

Quadro 29 – Plano de Aquisições para 2020 – Procedimentos transitados de 2019 – Medida EPI

FSS	Proc. N°	Designação	Descrição	Qtd	Valor unitário c/ IVA)	Encargo P/ 2020 (C/ IVA)	Data de Entrega	Observações
GNR	03/DPIE/2019	Coletes balísticos	Lote 1 - Coletes balísticos exterior Patrulha	1063	621,15	660 282,45	25-06-2020	541 Coletes entregues a 20 de janeiro e os restantes a 25 de junho
		Coletes balísticos	Lote 2 - Coletes balísticos interior IC	113	612,54	69 217,02	25-06-2020	53 Coletes entregues a 20 de janeiro e as restantes a 25 de junho
	38/DPIE/2019	Outros EPI	Lote 2 - Fato Anti bomba	1	62 761,98	62 761,98	31-01-2020	
Total GNR						792 261,45		
PSP	02/DPIE/2019	Outros EPI	Lote 2 - Escudos de proteção	800	90,39	72 314,16	2019	Execução financeira em 2020
	38/DPIE/2019	Outros EPI	Lote 3 - Fato anti bomba	1	61 980,93	61 980,93	31-01-2020	
	50/DPIE/2019	Outros EPI	Lote 1.1 - Aquisição de capacetes de proteção balística	100	1 056,19	105 618,87	21-02-2020	
		Outros EPI	Lote 1.2 - Aquisição de viseiras de proteção balística	25	265,43	6 635,85	01-04-2020	
	51/DPIE/2019	Outros EPI	Lote 2.1 - Luvas Táticas	1600	31,52	50 439,84	05-02-2020	
		Outros EPI	Lote 2.2 - Luvas	500	56,70	28 351,50	25-02-2020	
		Outros EPI	Lote 3 - Fato EPRI	70	552,27	38 658,90	23-03-2020	
Total PSP						364 000,05		
Total Geral						1 156 261,50		

Quadro 30 – Plano de Aquisições para 2020 – Novas necessidades reajustadas – Medida EPI

FSS	Designação	Descrição	Prioridade	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo P/ 2020 (c/ IVA)	Observações
GNR	Outros EPI	Luvras Policiais		1112	40,00	44 480,00	
	Outros EPI	Lanternas		1112	27,00	30 024,00	
	Outros EPI	Algemas com porta algemas		1112	43,00	47 816,00	
	Outros EPI	Escudo balístico c/ Viselra balística	1	1	6 200,00	6 200,00	
Total GNR						128 520,00	
PSP	Outros EPI	Capacetes de ordem pública		300	492,00	147 600,00	PABS nº 10DFAM2020
	Coletes balísticos	Coletes de Proteção Ballstica		1000	430,50	430 500,00	
	Coletes balísticos	Coletes		405	738,00	298 890,00	PABS nº 9DFAM2020
	Coletes balísticos	Placas rígidas		50	824,10	41 205,00	
	Outros EPI	Coletes de alta visibilidade (Trânsito)		810	39,98	32 379,75	
	Outros EPI	Coletes de alta visibilidade (PSP)		2000	39,98	79 950,00	PABS nº 8DFAM2020
	Outros EPI	Fatos de motociclista (conjunto)		250	539,97	134 992,50	
	Outros EPI	Cinturão com cinto em cordura		1100	24,60	27 060,00	
	Outros EPI	Porta carregador		3000	7,38	22 140,00	PABS nº 11DFAM2020
Outros EPI	Coldre para pistola glock		1000	36,90	36 900,00		
Total PSP						1 251 617,25	
SEF	Coletes balísticos	Colete balístico		260	615,00	159 900,00	PABS nº 21838/SEF/2020
	Outros EPI	Colete de alta visibilidade		300	11,93	3 579,00	PABS nº 13356/SEF/2020
Total SEF						163 479,00	
Total Geral						1 543 616,25	

No capítulo da execução material, o quadro e gráficos infra, clarificam o posicionamento relativo de bens entregues e a entregar no cenário geral da Medida, bem como as perspectivas de bens em fase de contratação e os encargos correspondentes.

Estima-se que todos os procedimentos aquisitivos resultem em entregas às FSS no presente exercício orçamental.

Quadro 31 – Indicador de execução material de EPI's previstos adquirir em 2020

Estado	FSS	Descrição	Qtd	Encargos (€)
1. EPI entregue	GNR	Coletes	1 176	729 499 €
		Outros	1	62 762 €
	PSP	Coletes	0	0 €
		Outros	2 296	291 686 €
	SEF	Coletes	0	0 €
		Outros	0	0 €
1. EPI entregue total			3 473	1 083 947 €
2. EPI por entregar	GNR	Coletes	0	0 €
		Outros	0	0 €
	PSP	Coletes	0	0 €
		Outros	0	0 €
	SEF	Coletes	0	0 €
		Outros	0	0 €
2. EPI por entregar total			0	0 €
3. EPI em fase de contratação	GNR	Coletes	0	0 €
		Outros	3 337	128 520 €
	PSP	Coletes	1 455	770 595 €
		Outros	8 460	481 022 €
	SEF	Coletes	260	159 900 €
		Outros	300	3 579 €
3. EPI em fase de contratação Total			13 812	1 543 616 €
Total	GNR	Coletes	1 176	729 499 €
		Outros	3 338	191 282 €
	PSP	Coletes	1 455	770 595 €
		Outros	10 756	772 708 €
	SEF	Coletes	260	159 900 €
		Outros	300	3 579 €
Total Coletes			2 891	1 659 994 €
Total Outros			14 394	967 569 €
Total Geral			17 285	2 627 564 €

Gráfico 6 – Quantidade de EPI's entregues e a entregar por FSS, em 2020


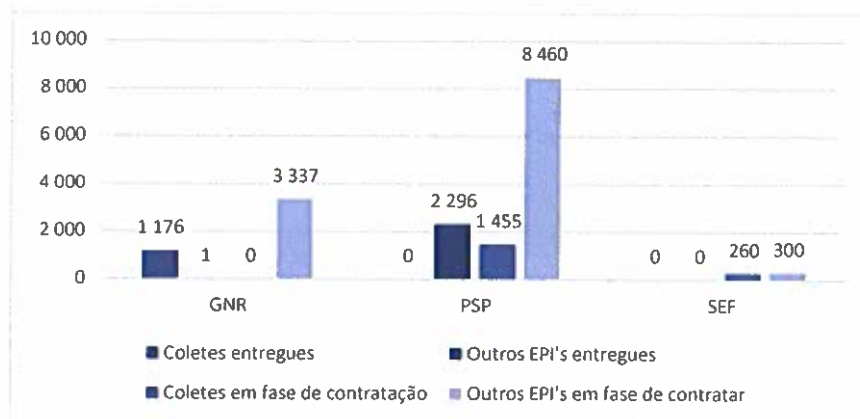


Gráfico 7 – Encargos com EPI's entregues e a entregar por FSS, em 2020

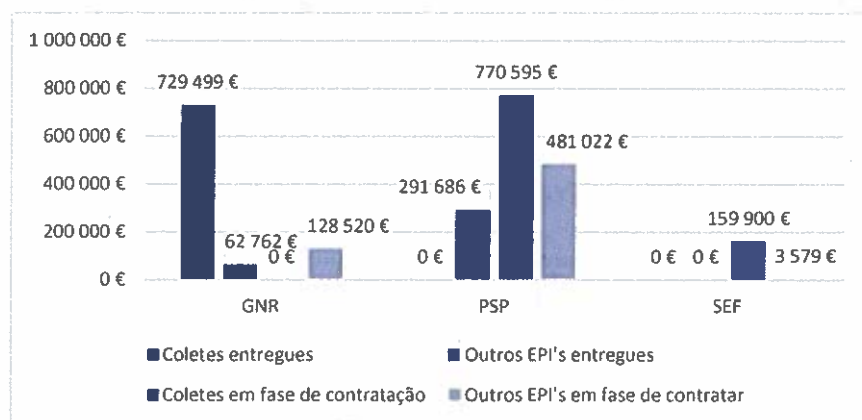

Os procedimentos iniciados em 2019, constantes no Quadro 29 acima foram executados na sua plenitude, sendo esperada a entrega total dos bens e respetiva execução financeira dos procedimentos em contratação.

Atualmente, a execução material nesta medida é de 20%.

5.5. Medida - Equipamento de Apoio à Atividade Operacional

No espectro de apetrechamento de instalações policiais através da modernização dos equipamentos para apoio da atividade operacional, da aquisição de armeiros para segurança do armamento distribuído e da melhoria das condições de atendimento ao cidadão, a SGMAI-DPIE procedeu à agregação das necessidades para promoção dos necessários procedimentos aquisitivos, estando já em fase pré contratual, sendo que os procedimentos transitados, já tiveram a sua total execução material e financeira:

Quadro 32 – Plano de Aquisições para 2020 – Procedimentos transitados de 2019 – Medida EAAOp

FSS	Observações	Designação	Descrição	Qtd	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Data de Entrega	Observações
GNR	08/DPIE/2019	EAAO	Lote 1 - Aquisição de mobiliário diverso ao abrigo do acordo quadro (UEPS, Almancil, Alcanena e Paços de Sousa) - Mobiliário Administrativo	166		22 315,89	19-03-2020	
GNR	46/DPIE/2019	EAAO	Lote 1 - Mobiliário para PT Salvaterra de Magos e PT Lever - Armários diversos	74		16 688,64	10-03-2020	
Total GNR						39 004,53		
PSP	23/DPIE/2019	EAAO	Lote 1 – Mobiliário diverso ao abrigo do Acordo Quadro para a PSP	235		32 009,52	07-05-2020	
Total PSP						32 009,52		
Total Geral						71 014,05		

Quadro 33 – Plano de Aquisições para 2020 – Novas necessidades – Medida EAAOp

FSS	Designação	Descrição	Prioridade	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Estimativa de Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
GNR	EAAO	Mobiliário diverso para equipar os Postos Territoriais de Serpa e Barrancos	1	438	59 904,69	59 904,69	Proc. 41/DPIE/2020 - Concurso Público Internacional lançado ao mercado, receção de propostas até 12-08-2020
	EAAO	Mobiliário diverso para equipar o Posto Territorial de Macedo de Cavaleiros	1	341	47 434,95	47 434,95	
	EAAO	Mobiliário diverso para equipar o Posto Territorial de Cucujães	1	252	36 820,05	36 820,05	
	EAAO	Mobiliário diverso para equipar o Posto Territorial do Livramento	1	198	27 047,70	27 047,70	
	EAAO	Mobiliário para equipar diversos Postos Territoriais	1		46 392,86	46 392,86	A aguardar PABS
Total GNR						217 600,25	
PSP	EAAO	Mobiliário Diverso (reequipamento e novas instalações)	1	1993	300 000,00	300 000,00	Proc. 2/DPIE/2020 - Concurso Público Internacional lançado ao mercado, receção de propostas até 17-07-2020
	EAAO	Eletrodomésticos	2	363	50 000,00	50 000,00	Proc. 8/DPIE/2020 - Elaboração de peças e informação de abertura
	EAAO	Equipamentos para lavandaria, cozinha e messe	3	12	50 000,00	50 000,00	
	EAAO	Cofres de parede	4	21	14 760,00	14 760,00	Proc. 5/DPIE/2020 - Elaboração de peças e informação de abertura
	EAAO	Equipamento ginásio ISCP SI	5	270	22 740,00	22 740,00	Proc. 7/DPIE/2020 - Elaboração de peças e informação de abertura
Total PSP						437 500,00	
Total Geral						655 100,25	

No aspeto da execução material, o quadro e gráficos infra, clarificam o posicionamento relativo de bens entregues e a entregar no cenário geral da Medida, bem como as perspetivas de bens em fase de contratação e os encargos correspondentes.

Quadro 34 – Indicador de execução material do EAAO previsto adquirir em 2020

Estado	FSS	Qtd	Encargos (€)
1. EAAO entregue	GNR	240	39 005 €
	PSP	235	32 010 €
1. EAAO entregue total		475	71 014 €
2. EAAO por entregar	GNR	0	0 €
	PSP	0	0 €
2. EAAO por entregar total		0	0 €
3. EAAO em fase de contratação	GNR	1 229	217 600 €
	PSP	2 659	437 500 €
3. EAAO em fase de contratação Total		3 888	655 100 €
Total	GNR	1 469	256 605 €
	PSP	2 894	469 510 €
Total Geral		4 363	726 114 €

Gráfico 8 – Quantidade de EAAO entregues e a entregar por FSS, em 2020


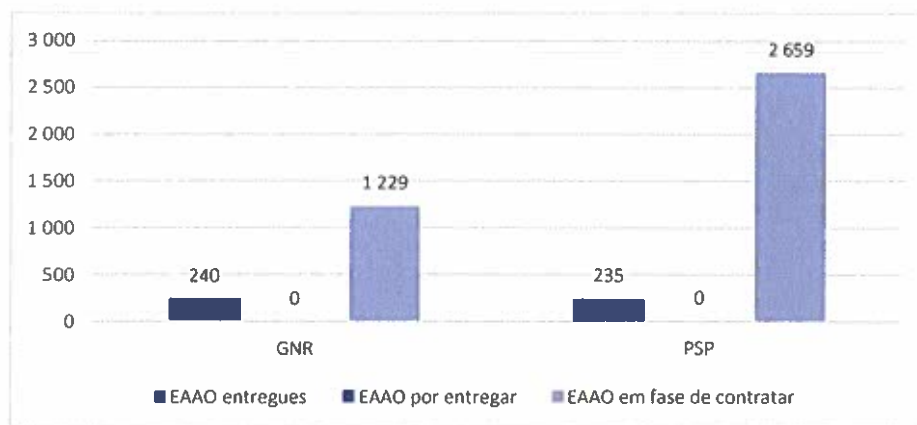


Gráfico 9 – Encargos com os EAAO entregues e a entregar por FSS, em 2020

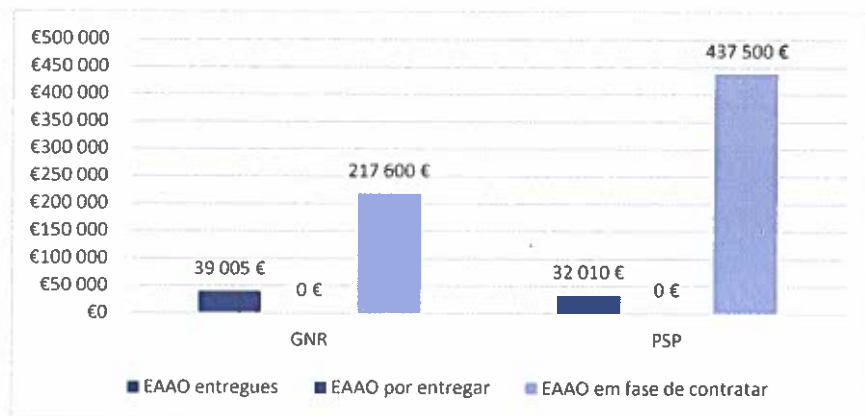

A Medida EAAOp tem assumido frequentemente um carácter complementar à medida Infraestruturas, no sentido em que vem possibilitar munir as novas ou reabilitadas instalações policiais com todo o equipamento de suporte à atividade operacional, pelo que a conclusão das obras ou a sua perspectiva próxima, vem suscitar novas necessidades que a LPIEFSS procura satisfazer.

Considerando os bens já entregues e o material cuja entrega se espera em 2020, esta medida apresenta 10,89% de execução material.

5.6. Medida - Equipamentos para Funções Especializadas

Esta medida apresenta como fim último modernizar e normalizar os equipamentos operacionais afetos a funções especializadas (trânsito, investigação criminal, ordem pública, inativação de engenhos explosivos, proteção da natureza, controlo costeiro, missões internacionais, entre outras), sendo que devido à tramitação pré-contratual dos procedimentos nº 1/DPIE/2019 e nº 16/DPIE/2019 ter transitado para o ano de 2020, com um valor associado de 3.654.251,92€, houve a necessidade de reajustar as necessidades aquisitivas. Apenas a PSP manteve algumas delas, conforme se poderá verificar no Quadro 36.

Apresenta-se a seguir um resumo dos procedimentos aquisitivos promovidos no âmbito da presente medida:

Quadro 35 – Plano de Aquisições para 2020 – Procedimentos transitados de 2019 – Medida EFE

FSS	Proc. Nº	Designação	Descrição	QTD 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Data de Entrega	Observações
GNR	01/DPIE/2019	EFE	Lote 1 - Alcoolímetro qualitativo	92	424,35	39 040,20		Bens por entregar
		EFE	Lote 2 - Alcoolímetro quantitativo	40	5 287,98	211 519,16		Bens por entregar
		EFE	Lote 3 - Alcoolímetro quantitativo portátil	9	4 151,25	37 361,25	17-06-2020	
		EFE	Lote 4 - Cinómetro-laser	4	61 500,00	246 000,00		Bens por entregar
		EFE	Lote 5 - Cinómetro-laser portátil	8	22 939,50	183 516,00		Bens por entregar
		EFE	Lote 6 - Cinómetro de perseguição	1	18 443,85	18 443,85		Bens por entregar
		EFE	Lote 7 - Cinómetro-radar	4	59 839,50	239 358,00		Bens por entregar
		EFE	Lote 8 - Balança de fiscalização de trânsito	8	13 422,38	107 379,00		Bens por entregar
		EFE	Lote 9 - Analisador de droga portátil para motociclos	40	3 075,00	123 000,00	15-06-2020	
		EFE	Lote 10 - Analisador de droga portátil para automóveis ligeiros	41	5 399,66	221 386,19		Bens por entregar
		EFE	Lote 11 - Leitor automático de matrículas	8	28 044,00	224 352,00	17-06-2020	
Total GNR						1 651 355,65		
PSP	16/DPIE/2019	EFE	Lote 3 - Cinómetro	32	12 115,50	387 696,00		A aguardar autorização de PEE para se poder emitir o compromisso para 2020 e notificar os adjudicatários para outorga dos contratos, carece ainda de Visto prévio do TC
		EFE	Lote 1 - Alcoolímetros Quantitativos	50	4 059,00	202 950,00		
		EFE	Lote 2 - Alcoolímetros Qualitativos	169	716,54	121 094,67		
		EFE	Lote 6.1 - Bloqueadores ligeiro de veículos	100	321,03	32 103,00		
		EFE	Lote 6.2 - Bloqueador de veículos TT e autocaravanas	20	413,28	8 265,60		
		EFE	Lote 4.1 - Sistema de Controlo de Velocidade Radar	19	59 839,50	1 136 950,50		
		EFE	Lote 4.2. - Sistema de Backoffice	6	10 448,85	62 693,10		
		EFE	Lote 5 - Equipamento de leitura digital de tacógrafos	63	811,80	51 143,40		
Total PSP						2 002 896,27		
Total Geral						3 654 251,92		

Quadro 36 – Plano de Aquisições para 2020 – Novas necessidades – Medida EFE

FSS	Designação	Descrição	Prioridade	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Estimativa de Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
PSP	EFE	Analizador portátil de estupefacientes no exercício da condução		24	5 233,65	125 607,60	PABS nº 12DFAM2020
	EFE	Barreiras portáteis bloqueio de veículos		23	6 150,00	141 450,00	
	EFE	Equipamento de iluminação autónomo		33	861,00	28 413,00	
Total Geral						295 470,60	

Na perspetiva da execução material, o quadro e gráficos infra, clarificam o posicionamento relativo de bens entregues e a entregar no cenário geral da Medida, bem como as perspetivas de bens em fase de contratação e os encargos correspondentes.

Quadro 37 – Indicador de execução material dos EFE's previstos adquirir em 2020

Estado	FSS	Qtd	Encargos (€)
1. EFE entregue	GNR	57	384 713 €
	PSP	0	0 €
1. EFE entregue Total		57	0 €
2. EFE por entregar	GNR	198	1 266 642 €
	PSP	459	2 002 896 €
2. EFE por entregar total		657	0 €
3. EFE em fase de contratação	GNR	0	0 €
	PSP	80	295 471 €
3. EFE em fase de contratação Total		80	0 €
Total	GNR	255	1 651 356 €
	PSP	539	2 298 367 €
Total Geral		794	3 949 723 €

Gráfico 10 – Quantidade de EFE's entregues e a entregar por FSS, em 2020


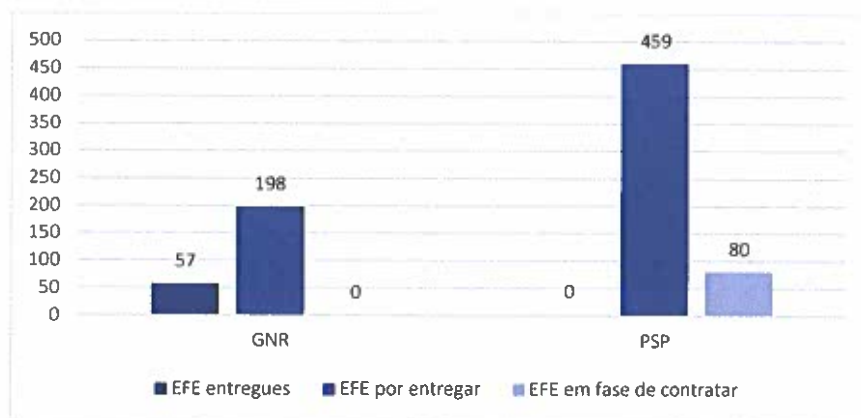


Gráfico 11 – Encargos com os EFE's entregues e a entregar por FSS, em 2020

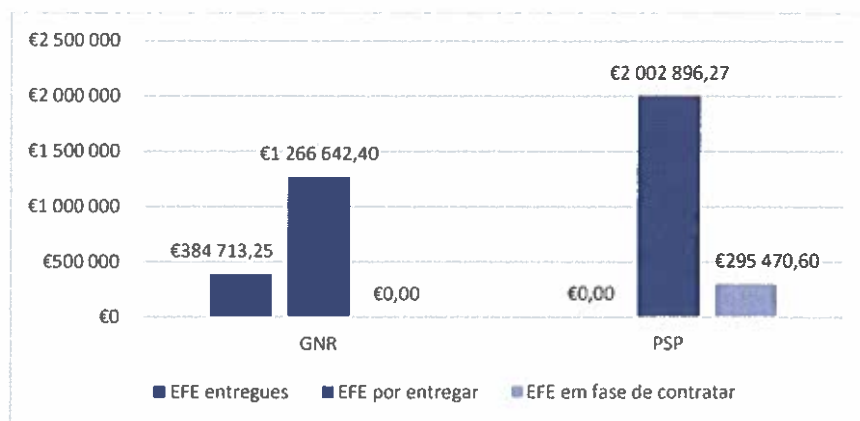

Estima-se que todos os equipamentos adquiridos sejam entregues às FSS no presente exercício orçamental.

A SGMAI-DPIE vai dar início ao lançamento dos procedimentos aquisitivos relativos a esta medida até ao limite da dotação disponível.

Quanto ao Procedimento 16/DPIE/2019, ainda se aguarda a publicação da Portaria de Extensão de Encargos para 2020, no valor de 2.002.896,27€, compromisso assumido em 2019 e transitado para o presente exercício.

Neste momento e pelos motivos já enunciados, a taxa de execução material é de 7,18%.

5.7. Medida - STIC

Esta medida baseia-se nos objetivos de garantir o desenvolvimento dos processos previstos no plano plurianual das tecnologias de informação e comunicação (TIC) como sejam o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal - SIRESP, Sistema de Informação Geográfica do Ministério da Administração Interna- GeoMAI, Linha 112, Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo -SIVICC, Cibersegurança, entre outros) e melhorar a integração das aplicações e a interoperabilidade dos sistemas TIC, reduzindo os custos de manutenção dos sistemas de informação e libertando recursos para a atividade operacional, para a prossecução dos objetivos definidos foram criados diversos projetos autónomos.

Expõe-se a seguir um resumo dos procedimentos aquisitivos, no âmbito do projeto 10359, promovidos em 2019 com execução material e/ou financeira no presente ano e das novas necessidades aquisitivas demonstradas pelas FSS cujos procedimentos pré-contratuais já se iniciaram ou se iniciarão, durante o presente ano:

Quadro 38 – Plano de Aquisições para 2020 – Procedimentos transitados de 2019 – Medida STIC

FSS	Proc. Nº	Designação	Qtd	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
GNR	106/DSUMC/2019	Aquisição de meios tecnológicos (SCOF) Lote 1 (Comput. Portátil)	80	45 851,94	Entrega dos bens em 2020
	106/DSUMC/2019	Aquisição de meios tecnológicos (SCOF) Lote 2 (Impressora e digitalizador portátil)	80	36 486,23	
	106/DSUMC/2019	Aquisição de meios tecnológicos (SCOF) Lote 3 (Comput. desktop)	7	12 613,65	
	106/DSUMC/2019	Aquisição de meios tecnológicos (SCOF) Lote 4 (Mala de transporte)	40	10 578,00	
	89/DSUMC/2019	Aquisição de switches e equipamento terminal de rede	404	233 158,14	Bens entregues em 2019, mas a fatura apenas foi paga em 2020
Total GNR				338 687,96	
PSP	4/DSUMC/2019	Aquisição de terminais móveis de comunicações TETRA para operação na rede SIRESP	1000	359 012,40	Bens entregues em 2019, mas a fatura apenas foi paga em 2020
Total PSP				359 012,40	
Total Geral				697 700,36	

No âmbito do PA2020 foram ainda demonstradas diversas necessidades aquisitivas que, entretanto, houve a necessidade de serem reduzidas e adaptadas, pelas FSS, aos saldos disponíveis para 2020.

Quadro 39 – Plano de Aquisições para 2020 – Novas necessidades – Medida STIC

FSS	Designação	Prioridade	Plurianual	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
	Storage para apoio à criação de File Servers para o dispositivo da GNR	1	Não	1	86 100,00	86 100,00	
	Upgrade da capacidade de Backup	1	Não	2	91 020,00	182 040,00	
	Software para apoio ao Business Intelligence policial	1	Não	1	131 610,00	131 610,00	
	Software de análise IBM i2 (licenças para utilização no Dispositivo da GNR)	1	Não	1	177 120,00	177 120,00	
	Software de pesquisa de identidades	1	Não	1	67 650,00	67 650,00	
	Solução de gestão SIOG 4.0	1	Não	1	184 500,00	184 500,00	
	Conjunto de software adaptados a várias necessidades operacionais e administrativas (10 lotes)	1	Não	1	369 000,00	369 000,00	
	UPS 1500 VA (1500VA p/ bastidor 25U/13U)	1	Não	20	750,30	15 006,00	PABS nº 2/DCSI/2020
	UPS 10KVA (c/ autonomia)	1	Não	1	7 004,85	7 004,85	
	Bastidores Equipados 19"	1	Não	20	1 242,30	24 846,00	PABS nº 3/DCSI/2020
	Computador de Secretária (Avançado)	1	Sim	940	584,25	549 195,00	PABS nº 4/DCSI/2020
	Mini-PC	1	Não	13	252,15	3 277,95	PABS nº 5/DCSI/2020
	Computador Portátil (Leve C/ Docking, Monitor e Rato)	1	Sim	20	1 150,05	23 001,00	PABS nº 4/DCSI/2020
	Computador Portátil (Leve)	1	Sim	100	861,00	86 100,00	
	Computador Portatil Touch Wifi Rugged (viatura)	1	Não	10	3 923,70	39 237,00	PABS nº 5/DCSI/2020
	Monitor 22" (Led)	1	Não	200	125,46	25 092,00	
GNR	Teclado (C/Leitor)	1	Não	400	36,90	14 760,00	
	Rato (Optico)	1	Não	400	19,68	7 872,00	PABS nº 4/DCSI/2020
	Discos Externos 2,5 (1TB)	1	Não	60	79,95	4 797,00	
	Discos externos STORAGE (4 TB)	1	Não	30	184,50	5 535,00	
	Discos internos 3.5 (1 TB)	1	Não	100	61,50	6 150,00	
	Rádio Portátil Tetra (TEA2)	1	Sim	1600	430,50	688 800,00	PABS nº 6/DCSI/2020
	Carregadores TETRA Coletivos	1	Sim	200	159,90	31 980,00	
	Rádios BA ICOM IC-A24E	1	Não	50	350,55	17 527,50	PABS nº 7/DCSI/2020
	Switch Layer 2 24p POE	1	Não	30	1 100,85	33 025,50	
	Switch Layer 3 24p POE	1	Não	8	3 690,00	29 520,00	PABS nº 8/DCSI/2020
	Access Points Wifi	1	Não	40	350,55	14 022,00	
	Interface SFP FO	1	Não	60	301,35	18 081,00	
	Telefones SIP simples (SIP GS 1625/ GS1630)	1	Não	500	38,13	19 065,00	
	Telefones SIP Operador (SIP GS 2160)	1	Não	60	98,40	5 904,00	PABS nº 9/DCSI/2020
	Videotelefonos SIP (SIP GXV)	1	Não	10	301,35	3 013,50	
	Videotelefonos para SSit (CISCO)	1	Não	10	633,45	6 334,50	PABS nº 8/DCSI/2020
	Intercomunicadores p/Postos atendimento Reduzido	1	Não	20	553,50	11 070,00	
	Telefones Licenciados IP simples (SAMA) (CISCO 7821)	1	Não	100	153,75	15 375,00	PABS nº 8/DCSI/2020
	Gateways GSM-IP 8 slots SIM	1	Não	10	1 094,70	10 947,00	PABS nº 9/DCSI/2020
	Kits Videoconferência USB	1	Não	10	1 150,05	11 500,50	PABS nº 1/DCSI/2020
	Impressoras Portáteis	1	Não	50	202,95	10 147,50	PABS nº 5/DCSI/2020
	Discos Externos 2.5 (3 TB)	1	Não	20	100,86	2 017,20	
	Total GNR					2 938 224,00	

FSS	Designação	Prioridade	Plurianual	Qtd 2020	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo p/ 2020 (c/ IVA)	Observações
PSP	Solução de Videoconferência para sala de Controlo multiponto		Não	1	102 090,00	102 090,00	Proc. nº 90/DSUMC/19 - Contratação concluída, a aguardar entrega e instalação
	Solução de Videoconferência para salas de Comando grandes		Não	3	3 485,00	10 455,00	
	Solução de Videoconferência para salas de Comando pequenas		Não	27	1 252,78	33 825,00	
	Instalação e formação de operadores		Não	1	25 584,00	25 584,00	
	Equipamentos Switch c/ PoE 48 portas		Não	300	2 091,00	627 300,00	
	Equipamentos Switch c/ PoE 24 portas		Não	400	1 107,00	442 800,00	
	SPF SX + chicote FO 2m		Não	200	246,00	49 200,00	
	Telefone básico SIP		Não	7000	46,74	327 180,00	
	Telefone avançado SIP		Não	500	129,15	64 575,00	
	Telefone p/ centrais de atendimento + módulo adicional		Não	60	430,50	25 830,00	
	Servidores file servers		Não	40	6 986,40	279 456,00	
	Teclados e ratos		Não	40	24,60	984,00	
	servidor de gestão de software de backups		Não	7	8 425,50	58 978,50	
	Servidores de gestão e virtualização		Não	2	12 300,00	24 600,00	
	Rádios SIRESP		Não	500	455,10	227 550,00	
	Carregadores Coletivos - Rádios		Não	50	246,00	12 300,00	
	Baterias para rádios Motorola		Não	600	39,36	23 616,00	
	Baterias para rádios Sepura		Não	1100	36,90	40 590,00	
	Computadores de secretária avançados		Não	500	725,70	362 850,00	
					Total PSP	2 739 763,50	
SEF	PC's Portáteis com Docking		Não	8	1 230,00	9 840,00	
					Total SEF	9 840,00	
					Total Geral	5 687 827,50	

No capítulo da execução material, os quadros e gráficos infra, clarificam o posicionamento relativo de bens entregues e a entregar no cenário geral da Medida, em fase de contratação e os encargos correspondentes.

Quadro 40 – Indicador de execução material do equipamento de STIC previsto adquirir em 2020

Estado	FSS	Qtd	Encargos (€)
1. STIC entregue	GNR	167	94 952 €
	PSP	0	0 €
	SEF	0	0 €
1. STIC entregue total		167	94 952 €
2. STIC por entregar	GNR	0	0 €
	PSP	32	171 954 €
	SEF	0	0 €
2. STIC por entregar total		32	171 954 €
3. STIC em fase de contratação	GNR	5100	2 938 224 €
	PSP	11299	2 567 810 €
	SEF	8	9 840 €
3. STIC em fase de contratação Total		16407	5 515 874 €
Total	GNR	5267	3 033 176 €
	PSP	11331	2 739 764 €
	SEF	8	9 840 €
Total Geral		16606	5 782 779 €

Gráfico 12 – Quantidade de Equipamentos STIC entregues e a entregar por FSS, em 2020


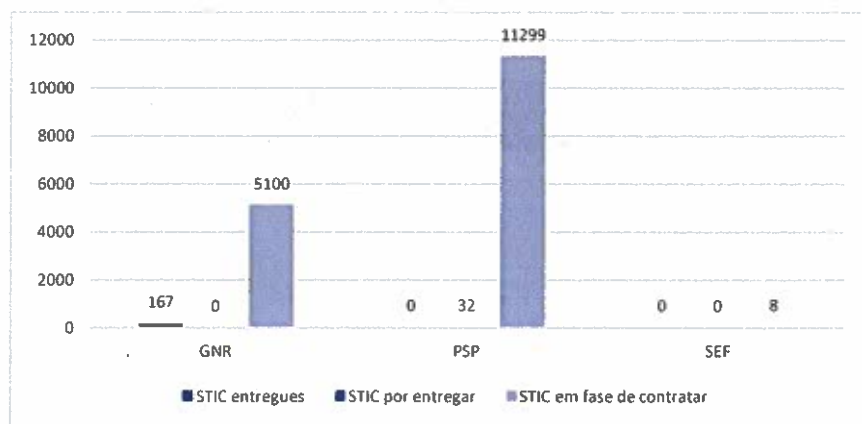


Gráfico 13 – Encargos com os Equipamentos STIC entregues e a entregar por FSS, em 2020

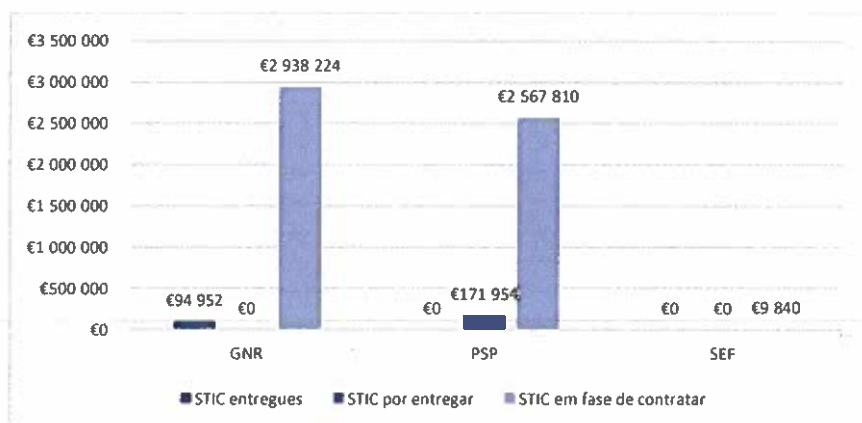

Os procedimentos iniciados e a iniciar em 2020, constantes do Quadro 39, estão ainda em fase pré-contratual, à exceção do Proc. 90/DSUMC/19 que já se encontra na fase de execução material, sendo expectável a entrega dos bens no presente exercício e a execução financeira na sua plenitude, de forma a evitar a perda de verba por não transição de saldos.

Até à presente data, a Medida STIC, no âmbito do projeto 10359, apresenta uma execução material de cerca de 1,01%, considerando os bens ainda a adquirir/em contratação.

Relativamente à execução material e financeira dos restantes projetos inseridos na presente medida de seguida apresenta-se o respetivo um quadro resumo.

Quadro 41 – Execução material e financeira outros projetos – Medida STIC

Projeto	Objeto	Execução 30/06/2020	Compromissos assumidos 2020	Total Compromissos 2020
9487-Comunicações de Segurança e emergência	Parceria Público-Privada SIRESP	14 670 473 €	12 751 433 €	27 421 905 €
	Fornecimento de energia elétrica	100 840 €	180 588 €	281 428 €
	Cedências e arrendamento de espaços das Antenas SIRESP	15 370 €	158 630 €	175 000 €
	LICENÇAS SOFTWARE M CADIMENSAGENS REDE SIRESP	8 557 €		8 557 €
	Aquisição de bens com instalação para reforço da cobertura rádio da rede SIRESP Aeroporto Hum		3 15 931 €	3 15 931 €
	Serviços de consultoria técnica	20 275 €		20 275 €
	Cedência espaços MEO	33 111 €		33 111 €
	Fechadura de uma Estação Base do SIRESP	319 €		319 €
	Substituição de 2 baterias nas estações móveis SIRESP	367 €		367 €
	Aq. estudos cobertura rádio e surveys rede SIRESP	18 970 €		18 970 €
	Aquisição de serviços de Reparação do Ramal Elétrico Alfragide	431 €		431 €
	Manutenção da Torre Base SIRESP Olivais	1838 €		1838 €
	Aquis. Serviços de Manutenção AC_SIRESP_MADEIRA	1397 €		1397 €
	Aq. dois terminais-rádio TETRA para utilização do COG-SIRESP	3 341 €		3 341 €
	Subtotal	14 876 958 €	13 407 579 €	28 283 537 €
9493-SIVICC - Fase de Garantia e Manutenção	Serviços de manutenção do SIVICC	388 528 €	192 169 €	2 310 145 €
	Subtotal	388 528 €	1 921 619 €	2 310 145 €
9777-112.PT - Financiamento Adicional	Contrato de manutenção do 112.pt	481 709 €	645 518 €	1 137 227 €
	Serviços SM® para o 112.pt	1 776 €	2 728 €	4 502 €
	Serviço de aluguer de Primários com comunicações 112.pt	8 155 €	12 456 €	20 621 €
	Arrendamento do edifício do CONOR 112	58 126 €	81 673 €	139 798 €
	Fornecimento de energia elétrica	15 490 €	20 798 €	36 288 €
	Mobiliário - 112.pt	11 533 €		11 533 €
	Meo - Cabo - Televisão		66 €	66 €
	Manutenção dos equipamentos CONOR	7 380 €	11 808 €	19 188 €
	Serviços técnico responsável de instalações elétricas (TREIE) Conor		2 435 €	2 435 €
	serviços de atendimento no 112 para cidadãos surdos	23 051 €		23 051 €
	BATERIAS UPS/112.PT		6 089 €	6 089 €
	REPARAÇÃO EQUIPAMENTO 112CONOR		803 €	803 €
	Formação dos intérpretes no atendimento aos cidadãos surdos	2 795 €		2 795 €
	Cartões de acesso ao COSUL	472 €		472 €
	Serviços de reparação de equipamentos no CONOR	838 €		838 €
Subtotal	621 333 €	784 389 €	1 405 702 €	
10096-112.PT - Investimentos Complementares	Ser. atualização tecnológica e extensão a Açores e Madeira	47 050 €	1 251 150 €	1 668 200 €
	Subtotal	47 050 €	1 251 150 €	1 668 200 €
10100-Microsoft - Licenciamento Informático para a Segurança Interna	Licenciamento Microsoft "Servidores e Core Call"	5 521 662 €		5 521 662 €
	Subtotal	5 521 662 €	0 €	5 521 662 €
10103-GEOMAI - Projetos a Candidatar	Licenciamento Enterprise License Agreement (ELA) geolocalização		364 695 €	364 695 €
	Subtotal	0 €	364 695 €	364 695 €
10143-Cibersegurança do MAI	Serviços de distribuição de conteúdos de aplicações do MAI	52 272 €		52 272 €
	Upgrade da plataforma redundante de apoio ao sistema central call manager		388 878 €	388 878 €
	Solução PROXY para RNSI		429 138 €	429 138 €
	Solução de controlo e proteção de email		301 131 €	301 131 €
Subtotal	52 272 €	1 118 947 €	1 171 219 €	
TOTAL		21 076 801 €	18 848 368 €	40 725 159 €

6. Conclusões

O presente Relatório ao proceder à monitorização da Lei em questão, procura transmitir e fomentar princípios de transparência, prestação de contas e mecanismos de controlo vertical e horizontal.

A execução material e financeira da Lei tem beneficiado da implementação de boas práticas importadas, parcialmente pelo Manual de Procedimentos, bem como pelo Relatório de Oportunidades de Melhoria, agilizando a comunicação e promovendo o aumento da eficiência dos procedimentos aquisitivos.

Ao olharmos para os pagamentos já efetuados chegamos a uma percentagem de 37% de execução financeira, face ao mapa de programação inicial para 2020, enquanto que ao compararmos com a dotação corrigida líquida a taxa é de 27 %, o que nos permite perceber uma relativa manobrabilidade financeira, em especial fruto da medida Infraestruturas, apesar dos cabimentos já emitidos e compromissos assumidos.

A interpretação que fazemos e que deriva, naturalmente, da própria índole do documento financeiro “cabimento” *per si*, é que a sua emissão se traduz na clara intenção de contratação de serviços, bens ou empreitadas, apesar de não ser certa a sua execução plena no presente exercício. Para que tal aconteça, algo esperado pela SGMAI-DPIE e pelos *stakeholders* da LPIEFSS, é necessário que a execução em ambas as dimensões se faça de forma oportuna, ficando dependente da tramitação pré-contratual, da execução do contrato e da formalidade de emissão, validação e processamento de faturas.

Como já referido no ponto 4. do presente documento, a DPIE propõe-se a lançar os procedimentos referentes às necessidades apresentadas e às quais corresponderam o envio de Propostas de Aquisição de Bens e Serviços (PABS), bem como a garantir a execução material e financeira dos contratos já em execução e transitados do ano anterior. Quanto aos primeiros, devido à exiguidade do espaço temporal, promovida pela pandemia de dimensão mundial que impôs vários períodos de Estado de Emergência, bem como pela publicação do Orçamento de Estado de 2020 em maio e na mesma linha a aprovação do Plano de Aquisições apenas no mesmo mês, espera-se que a sua execução plena se verifique no presente ano, contudo pela experiência de exercícios anteriores, é legítima a posição e a expectativa de transição parcial da sua execução para 2021.

Nesse sentido, conclui-se que deverá ser feito um esforço suplementar no sentido da execução plena dos procedimentos sem caráter plurianual, de forma a prevenir a perda de verba não transitável quer em medidas em que a transição é automática, mas apenas quando provenientes de certas Fontes de Financiamento, ou em Medidas sem transição de saldos da gerência anterior. O resultado, naturalmente, não depende única e exclusivamente da SGMAI-DPIE, pelo que irão ser encetados todos os esforços para o

lançamento dos procedimentos em tempo de forma a atingir uma percentagem de execução material e financeira de 100% até ao final do ano.

Assim e em sùmula, a execução material e financeira é mais prevalente nas medidas Veículos e STIC pelo seu caráter plurianual. Na medida Infraestruturas, 2 empreitadas foram já concluídas no presente exercício, estando 19 em curso e 21 empreitadas em fase de contratação pela DPIE e pelas Câmaras Municipais com as quais foram celebrados Contratos Interadministrativos.

A medida EFE está ainda refém dos procedimentos que transitaram de 2019, sendo que os procedimentos serão lançados até ao limite da capacidade orçamental. Para a execução oportuna desta medida, será determinante a publicação da Portaria de encargos plurianuais, uma vez que os saldos de gerência anterior não são transitáveis para o exercício seguinte, pelo que a perda de verba, tal como sucedeu em 2019, por este mecanismo deverá ser acautelada.

A medida EAAO está em fase de contratação dos procedimentos referentes a 2020, sendo expectável a entrega plena dos bens neste exercício.

A medida EPI foi executada completamente no que respeita ao transitado de 2019, sendo que estão a ser iniciados os procedimentos para satisfazer as necessidades atuais. Na mesma linha programática a medida Armamento encontra-se em fase de início da tramitação pré-contratual das necessidades referentes às PAB's já remetidas pelas FSS.

No que respeita à execução da LPIEFSS, no segundo semestre do ano, pretende a SGM AI-DPIE:

1. Terminar a execução material e financeira dos procedimentos transitados do exercício anterior;
2. Terminar a execução material dos procedimentos aquisitivos lançados no final do primeiro semestre/início do segundo semestre;
3. Promover o lançamento dos procedimentos aquisitivos das medidas Armamento, EFE e EPI;
4. Até ao final do terceiro trimestre de 2020, articular com as FSS e com as restantes subunidades orgânicas da SGM AI, o planeamento das necessidades a satisfazer em 2021, delineando o Plano de Aquisições do próximo exercício.
