

# Relatório de Avaliação Intercalar do Projecto Estaleiro TICE.PT

31.05.2010

Estaleiro TICE.PT - Projecto 7591

## 1 - Apreciação global da execução física e financeira do projecto e justificação dos desvios


O Projecto 7591 Estaleiro TICE.PT terminou o 1º ano de actividade com a execução financeira de 402.330,08 Euros correspondendo a 26.65% do investimento global elegível de 1.509.940,00 Euros. Relativamente ao valor planeado para o 1º ano, 503.640,04 Euros, o grau de execução foi de 79,88%.

Durante o 1º ano foi solicitado ao COMPETE um adiantamento no valor de 15 % do montante a financiar, 1.132,455 Euros (75% do elegível), tendo sido recebido, em 8 de Fevereiro de 2010, o montante de 169.868,25 Euros. Foi igualmente apresentado em 27 de Maio um pedido de reembolso intercalar, no valor de 267.667,82 Euros

O Projecto Estaleiro TICE.PT encontra-se dividido em 6 actividades: Gestão e Coordenação, Concertação TICE.PT, Interface com a Envolvente, Internacionalização TICE.PT, Acompanhamento do Sector Económico e Divulgação e Disseminação.


### Grau de execução – 1º ano: (em Euros)

Actividades	Executado 1º ano	Faltou executar	Previsto 1º- ano	% Execução
Actividade 1 - Gestão e Coordenação	192.690,55	55.709,49	248.400,04	77,57%
Actividade 2 - Concertação TICE.PT	111.664,14	-54.964,14	56.700,00	196,94%
Actividade 3 - Interface com a Envolvente	2.247,08	1.672,92	3.920,00	57,32%
Actividade 4 - Internacionalização TICE.PT	72.722,39	47.277,61	120.000,00	60,60%
Actividade 5 - Acompanhamento Sector Económico TICE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Actividade 6 - Divulgação e Disseminação	23.005,92	11.614,08	34.620,00	66,45%
<b>Total</b>	<b>402.330,08</b>	<b>101.309,96</b>	<b>503.640,04</b>	<b>79,88%</b>

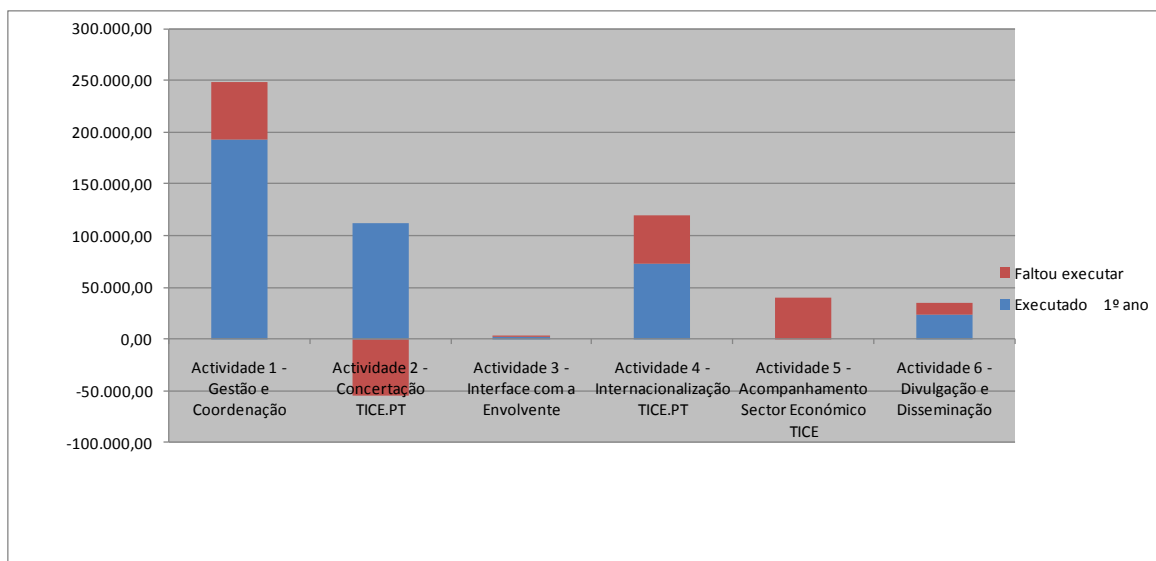

**Grau de execução relativamente ao total do projecto: (em Euros)**

Actividades	Executado 1º ano	Falta Realizar	Total projecto	% Execução
<b>Actividade 1 - Gestão e Coordenação</b>	<b>192.690,55</b>	<b>486.409,45</b>	<b>679.100,00</b>	<b>28,37%</b>
<b>Actividade 2 - Concertação TICE.PT</b>	<b>111.664,14</b>	<b>101.035,86</b>	<b>212.700,00</b>	<b>52,50%</b>
<b>Actividade 3 - Interface com a Envoltente</b>	<b>2.247,08</b>	<b>9.512,92</b>	<b>11.760,00</b>	<b>19,11%</b>
<b>Actividade 4 - Internacionalização TICE.PT</b>	<b>72.722,39</b>	<b>299.277,61</b>	<b>372.000,00</b>	<b>19,55%</b>
<b>Actividade 5 - Acompanhamento Sector Económico TICE</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Actividade 6 - Divulgação e Disseminação</b>	<b>23.005,92</b>	<b>86.374,08</b>	<b>109.380,00</b>	<b>21,03%</b>
<b>Total</b>	<b>402.330,08</b>	<b>1.107.609,92</b>	<b>1.509.940,00</b>	<b>26,65%</b>

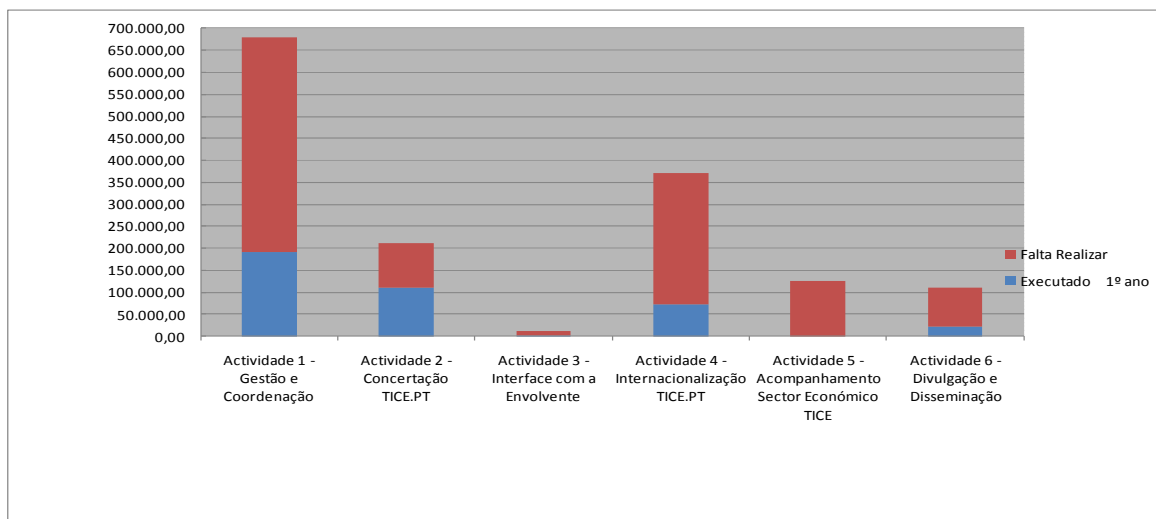

A **Actividade 1 – Gestão e Coordenação**, permitiu assegurar o funcionamento do PCT TICE.PT, nomeadamente através da vertente de suporte operacional, bem como da coordenação de várias actividades onde este Pólo se envolveu. Na divulgação e partilha de informação, destaca-se a criação e actualização do Site ([www.tice.pt](http://www.tice.pt)), bem como a elaboração de diversas brochuras, panfletos e informação relevantes. O Relatório & Contas 2009 encontra-se em distribuição para cerca de 300 entidades nacionais. Foram contratados 3 recursos humanos necessários à boa prossecução do projecto. Nesta actividade, a que apresenta maior valor de investimento aprovado, 679.100,00 Euros, foram executados 28,37% do total. Esta actividade atingiu o valor de 192.690,54 Euros, ou seja 77,57% dos 248.400,04 Euros elegíveis para o primeiro ano. O desvio mais significativo ocorreu na rubrica dos Recursos Humanos, dado que a equipa técnica apenas foi formalmente contratada a partir de Janeiro de 2010.

A **Actividade 2 - Concertação TICE.PT**, assumiu-se como a actividade que permitiu o acompanhamento das candidaturas dos Projectos Âncora e Complementares constantes do Programa de Acção aprovado. Verifica-se que as candidaturas efectuadas envolveram um total de 88 entidades das quais 60 são Empresas, sendo 47 PMEs, 17 pertencem ao SCTN e 8 são Associações.

Foram realizadas 3 reuniões de concertação, a 27.03.2009, em Guimarães, a 16.10.2009 em Coimbra e a 06.05.2010 na Caparica.

Esta actividade, financiada por 212.700,00 Euros, atingiu o valor de 111.664,14 Euros no final deste primeiro ano de projecto, o que corresponde a um grau de execução de 52,50%.

A **Actividade 3 - Interface com a Envolvente**, enquadró várias reuniões, entre as quais três encontros dos PCT's, uma reunião na ANACOM, uma reunião com o Plano Tecnológico da Educação, duas Reuniões no Ministério da Economia, versando projectos Inter Pólos e Concertação nos projectos de Mobilidade. A despesa, relativamente ao primeiro ano, cifrou-se em 2.247,08 Euros, correspondendo a um grau de execução de 57,32%. Relativamente ao valor total aprovado, 11.760,00 Euros, o grau de execução foi de 19,11%.

A **Actividade 4 – Internacionalização TICE.PT** enquadra a participação em feiras e eventos internacionais, sendo de destacar a participação na CeBIT 2010, ocorrida na Alemanha. Nesta feira participaram, num Stand de 200 M2 que o TICE promoveu em colaboração com a Inova-Ria e a ANETIE, 9 empresas nacionais na sua maioria PMEs. Foi lançada a marca “Schola.PT” – marca registada pelo TICE.PT, que promove produtos e serviços de tecnologia portuguesa para a área da Aprendizagem e do Conhecimento. O valor atingido foi de 72.722,39 Euros correspondendo a um grau de execução de 60,6 % relativamente ao primeiro ano do projecto e de 19,55%, relativamente ao valor global de 372.000 Euros

A **Actividade 5 - Acompanhamento do Sector Económico TICE** enquadra a realização de estudos e a recolha de indicadores de impacto. Foi elaborado pela equipa técnica do TICE.PT um caderno de encargos, relativo ao “Estudo sobre os produtos e serviços TICE de tecnologia nacional”, que permitirá lançar um concurso limitado até ao final do corrente mês. Esta actividade não teve assim qualquer execução financeira no 1º ano do projecto.

A **Actividade 6, Divulgação e Disseminação TICE.PT**, consubstanciou-se em vários eventos nacionais em que o TICE participou. Importa destacar a organização do Seminário “A internacionalização do Sector TICE” em Aveiro bem como o evento “Internet do Futuro – Desafios e oportunidades”, decorrido em Maio de 2010. O TICE participou, igualmente, na feira Qualific@. Dos 109.380,00 Euros aprovados para os três anos de projecto, encontram-se realizados 21,03%, correspondendo a um valor de 23.005,92 Euros. Relativamente ao primeiro ano do projecto o grau de execução foi de 66,45%.

## **2 - Cumprimento das condicionantes contratuais (cláusula 5ª do contrato de concessão de financiamento)**

O Pólo de Competitividade e Tecnologia, foi reconhecido, no âmbito das estratégias de Eficiência Colectiva (EEC's), por contrato assinado a 17 de Julho de 2009.

De acordo com o parecer jurídico, já enviado ao Compete, considera-se que a Associação TICE.PT não está sujeita ao regime de contratação pública. Apesar disso o TICE.PT tem orientado a sua actuação tendo em conta as práticas e os montantes previstos no código da contratação pública.

O TICE tem presente que as entidades adjudicantes do tipo 2 (Artº 2º, nr. 2 do CCP) só podem realizar operações de ajuste directo em contratos de Prestação de Serviços, para valores inferiores a 206.000,00 Euros (2009) e 193.000,00 Euros (2010). É necessário, igualmente, e segundo o nr. 2, Artº. 113º do CCP, que durante 3 anos, estes limites não sejam ultrapassados para o mesmo fornecedor, em contratos “cujo objecto seja constituído por prestações do mesmo tipo ou idênticas às do contrato a celebrar”. No TICE assume-se como preocupação diária, o pedido de orçamentos e respectivas adjudicações de acordo com as boas práticas de contratação e transparência.

No âmbito das EEC's, o Pólo tem desenvolvido, actividades de animação, coordenação e gestão de parcerias, nomeadamente ao nível das variadas reuniões, actividades de promoção e eventos

em que tem estado presente ou, aos quais, tem prestado apoio logístico e/ou promocional e publicitário. Estas actividades têm sido publicitadas aos mais variados níveis – Site TICE.PT, Imprensa escrita, Outdoors, publicidade diversa. Os logótipos do COMPETE, QREN e União Europeia estão presentes em todos os documentos promocionais da responsabilidade do TICE.

### **3 - Cumprimento das obrigações contratuais (cláusula 7ª do contrato de concessão de financiamento)**

Relativamente às obrigações contraídas no Âmbito da Assinatura do Projecto “Estaleiro TICE.PT”, verificamos que, e remetendo para as alíneas constantes do Contrato de Financiamento 7591, Estaleiro TICE.PT, clausula 7ª.:

- a) O projecto Estaleiro TICE.PT tem sido implementado nos termos em que foi aprovado. Algum atraso que se verifica na sua execução deve-se a questões pontuais e, também, à necessidade de fomentar e implementar as diversas actividades financiadas com bastante critério e correcção. Como tal, a preocupação com os prazos tem sido constante, embora a filosofia que tem pautado a implementação do Estaleiro, seja uma filosofia de eficiência e eficácia nos resultados que se procuram atingir.
- b) As obrigações fiscais e para com a Segurança Social têm sido devidamente solvidas, conforme a AG (Autoridade Gestora) poderá verificar, através da permissão para acesso à verificação desse cumprimento, já cedida pelo TICE.PT.
- c) O TICE.PT tem fornecido, dentro de limites razoáveis e/ou regulamentados, todas as informações solicitadas.
- d) Não existem alterações passíveis de colocar em causa a boa prossecução do projecto.
- e) Cumprido.
- f) Sem nada de relevante a observar.
- g) A contabilidade encontra-se organizada de acordo com o POC em 2009 e com o SNC a partir de 2010.
- h) Todos os documentos necessários à verificação do projecto, comprovativos de despesa, contratos realizados, que possibilitam a boa análise, acompanhamento e fiscalização do mesmo, encontram-se nas instalações do TICE, devidamente arquivados em dossiers específicos para o efeito.
- i) Ver ponto h)
- j) Ver ponto h)
- k) Embora tenha o TICE.PT documento jurídico, emitido por conceituada empresa de advogados, mencionando a não consideração do TICE.PT como entidade susceptível de ser considerada como adjudicante nos termos do código de contratação pública, tem o TICE.PT orientado a sua gestão, pelo respeito por esse normativo legal mencionado.

- l) Cumprido.
- m) Cumprido. Os Logótipos COMPETE, QREN e UE têm sido sempre utilizados pelo TICE.
- n) Cumprido.
- o) Cumprido. Os centros de custo 2 a 7 correspondem às actividades 1 a 6 do projecto Estaleiro TICE.PT.
- p) Não aplicável – período de 5 anos após o encerramento do projecto.
- q) Sem nada de relevante a observar.
- r) Cumprido. No pedido a título de reembolso intercalar, efectuado no final de Maio de 2010, este procedimento foi respeitado e o ROC certificou as despesas.
- s) Conforme mencionado neste documento, participámos e fomos promotores ou co-promotores de várias acções de divulgação. O Relatório & Contas de 2009 vai ser enviado para cerca de 300 entidades.

#### **4 - Enquadramento em Estratégias de Eficiência Colectiva**

O TICE.PT foi aprovado em 17 de Julho de 2009.

Dado o impacto transversal das TICE noutros sectores de actividade, assume especial relevância a interface com os agregados económicos em torno das EEC – Estratégias de Eficiência Colectiva, recentemente aprovadas, designadamente: os PCT da Energia, através da área vertical Eficiência Energética e Ambiente Sustentável, da Saúde, através da área vertical Saúde e Qualidade de Vida, do Automóvel e Mobilidade, através da área vertical Mobilidade, e Engineering & Tooling através da área de intervenção Formação e Qualificação (área da segurança informática) e Cluster das Industrias Criativas, através da área vertical “Cultura e Lazer”. A Versão do Programa de Acção aprovada contemplou já projectos âncora e complementares nestas áreas.

É também de referir a articulação com a iniciativa associada às Redes de Nova Geração, que constitui uma oportunidade relevante para o desenvolvimento e lançamento de produtos, serviços e aplicações de tecnologia nacional.

A cooperação com outros PCT é ainda reforçada através da participação cruzada de vários associados TICE.PT. Para além disso, é de referir que o Conselho Consultivo da Associação TICE.PT integra personalidades de reconhecido mérito com proximidade a outras estratégias de eficiência colectiva, como é o caso dos PCT da Energia, da Saúde e do Automóvel e Mobilidade.

Foram realizadas várias reuniões envolvendo diversas entidades, nomeadamente:

05.01.2010 – Encontros PCTs, TecMaia;

12.01.2010 – Encontro PCTs com o COMPETE, Lisboa;

19.01.2010 – Apresentação do TICE.PT à ANACOM;

28.01.2010 – Projectos inter-pólos, Ministério da Economia;

28.01.2010 – Reunião do Plano Tecnológico da Educação, Lisboa

04.02.2010 – Reunião Ministério da Economia – Concertação projectos de mobilidade;

26.03.2010 - Workshop "Os Pólos e Clusters de Competitividade e Tecnologia no Programa Quadro", Alfragide;

17.05.2010 – Reunião PCT + Cluster, Aveiro.

## 5 – Identificação dos participantes

A lista de Associados é apresentada em Anexo

## 6 – Indicadores de projecto

Ao nível dos resultados e impactos previstos para o primeiro ano, são apresentados os seguintes quadros resumo:

### Indicadores Gerais

Nº	Indicador	Meta a atingir	Nr alcançado
1	Total de empresas alvo do Projecto	26	28
2	PME alvo do projecto	100	87
3	PME envolvidas em redes de cooperação	25	132

### Actividades de Animação, coordenação e gestão de parceria no âmbito de EEC

Nº	Indicador	Meta a atingir	Nr alcançado
1	Entidades envolvidas na rede	46	50
2	Sessões de dinamização/animação da rede	114	73

### Resultados directos

	Objectivo (3 anos)	Objectivo (1 ano)	Executadas
Assembleias Gerais	6	2	4
Conselho Consultivo	6	2	1
Conselho Director	12	4	16
Comissão Executiva	33	11	29
Reuniões de controlo (COMPETE)	6	2	1
Reuniões Concertação	6	2	3
Interface com outras EEC	6	2	3
Interface com outras entidades	9	3	1
Participação em congressos Internacionais	12	4	2
Participação em feiras Internacionais	6	2	1
Relatório Benchmarking	3	1	0
Inventariação Projectos e Portfolio Produtos Serviços	3	1	0
Evento anual - Summerschool	3	1	1
Eventos Nacionais	9	3	7

Relativamente aos Indicadores de Impacto não existem ainda condições para a sua apresentação.

O trabalho de recolha de informações e acompanhamento destes indicadores continua. Até Maio de 2010, foram contactados e/ou consultados, de diversas formas, o GPEARI, base de Dados PORDATA, Portal do Governo, site Portugal Tecnológico, Banco de Portugal, INE, IPQ, Publicações Directas, diversas bibliotecas e a UMIC – Agencia para a Sociedade do Conhecimento.

Constata-se que o esforço necessário para a obtenção dos indicadores será muito maior do que inicialmente planeado.

### 7 – Equipa de pessoal afecta ao projecto

Ver Anexo.

### 8 – Receitas originadas pelo desenvolvimento do projecto

Os fundos financeiros próprios resultam à partida da contribuição dos associados em termos de jóias/quotas, cujo valor é escalonado de acordo com a sua dimensão. Foram estes fundos que suportaram o funcionamento do pólo na sua fase embrionária, nomeadamente durante todo o ano de 2009 e que, após a aprovação do financiamento por parte do Compete, continuam a suportar a parte não comparticipada, bem como os custos considerados não elegíveis. As acções



desenvolvidas no sentido do reforço dos fundos financeiros próprios têm-se centrado na sensibilização para angariação de novos associados e conseqüentemente no acréscimo das quotizações.

O valor previsto das quotas para 2010 é de 142.500,00€, dos quais, a 31 de Maio, já se encontra executado 74,04%, o que corresponde a 105.500,00€.

Na realização do Workshop “Internet do Futuro – desafios e oportunidades”, que ocorreu entre 25 e 26 de Maio de 2010, o TICE recebeu valores relativos à inscrição de várias pessoas, fora do universo dos Associados. O total dos montantes recebidos ascendeu a 3.450,00 Euros.

### **9 – Proposta de alocação de verbas**

Tendo em conta o grau de execução do projecto e a sua distribuição pelas diferentes actividades, está em preparação uma proposta detalhada para uma nova alocação de verbas.

Em termos gerais propõe-se que o montante de 101.309,96 Euros, não executado no 1º ano do projecto, seja transferido para os 2º e 3º anos permitindo vir a reforçar a Actividade 2 - Concertação TICE.PT, nomeadamente na componente de gestão de projectos.
