

Assembleia da
República |
Subcomissão de
Fundos Europeus e
PRR



Comissão Nacional
de Acompanhamento
do Plano de Recuperação
e Resiliência

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL | 2022

28/2/2023

O relatório anual de 2022

Resultado de um processo participado

Contributo para um processo de melhoria contínua

Reforço do conhecimento e literacia sobre o PRR


Índice


1. Execução Financeira
2. Apreciação Crítica
3. Balanço Final e Recomendações

Execução física e financeira



Montante dos projetos aprovados (milhões €)

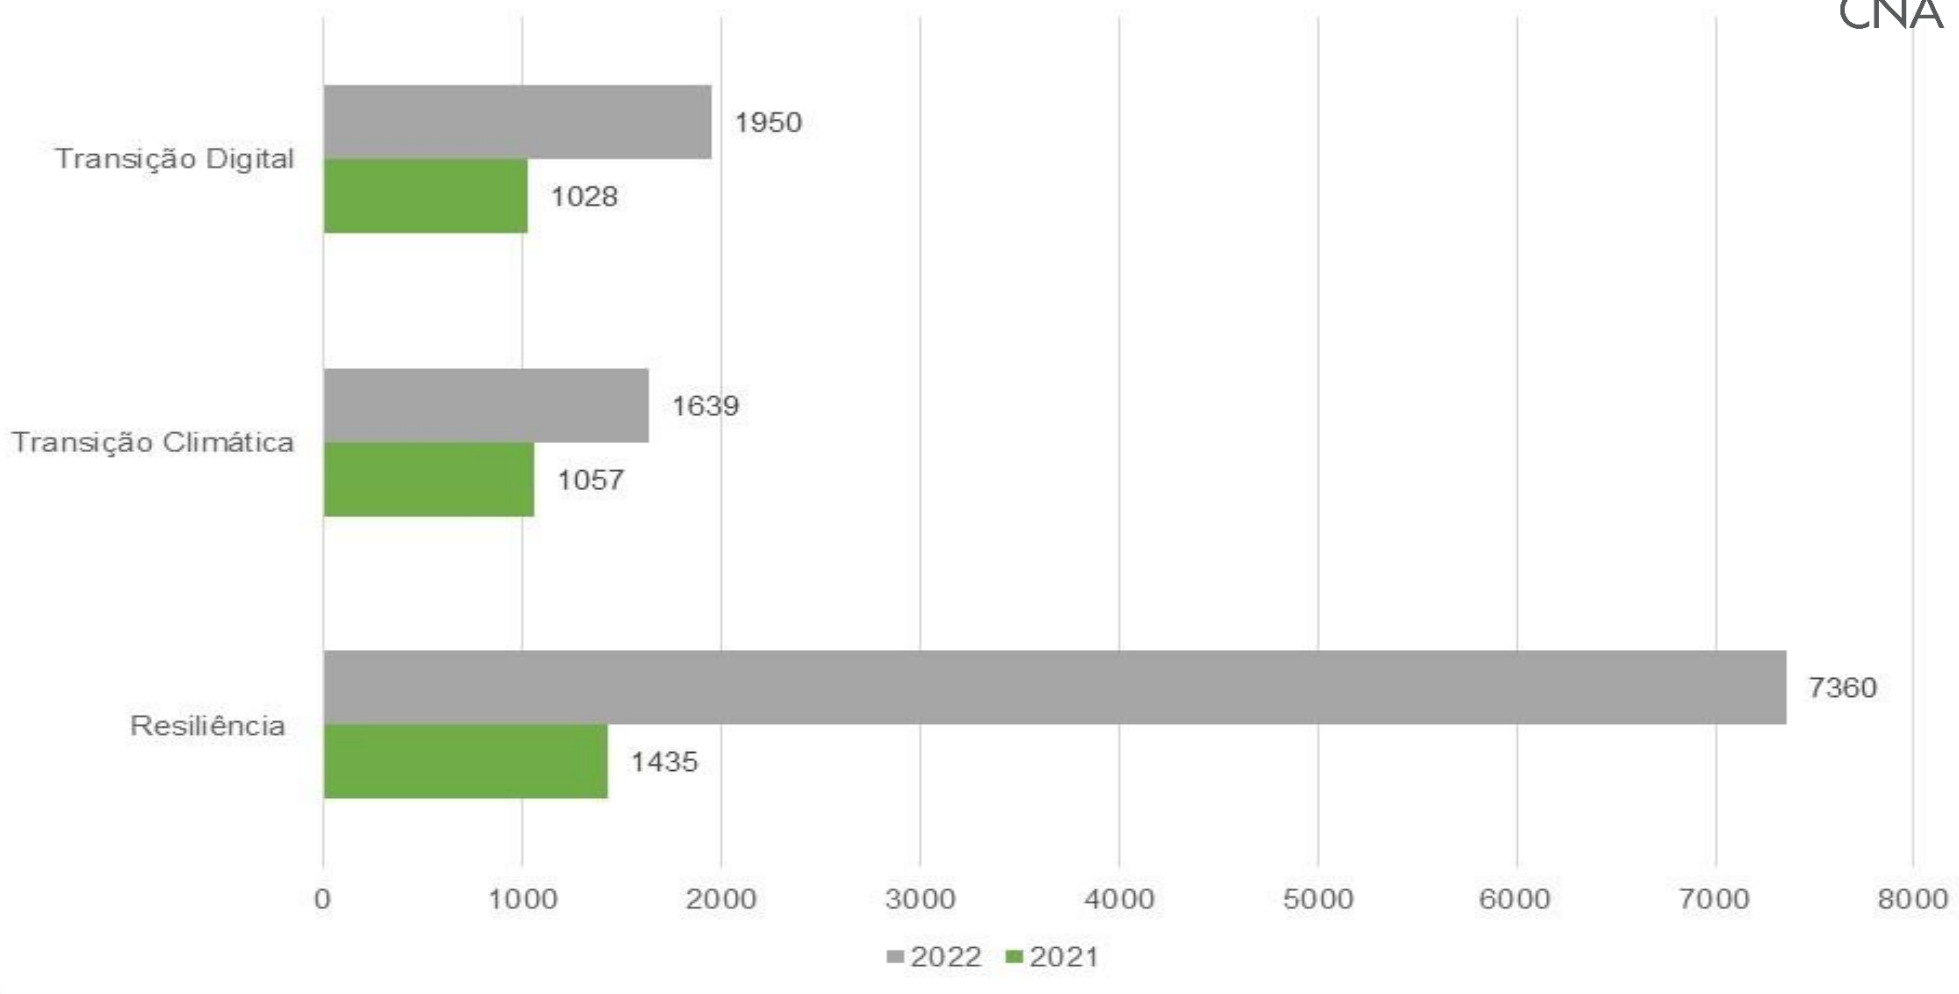

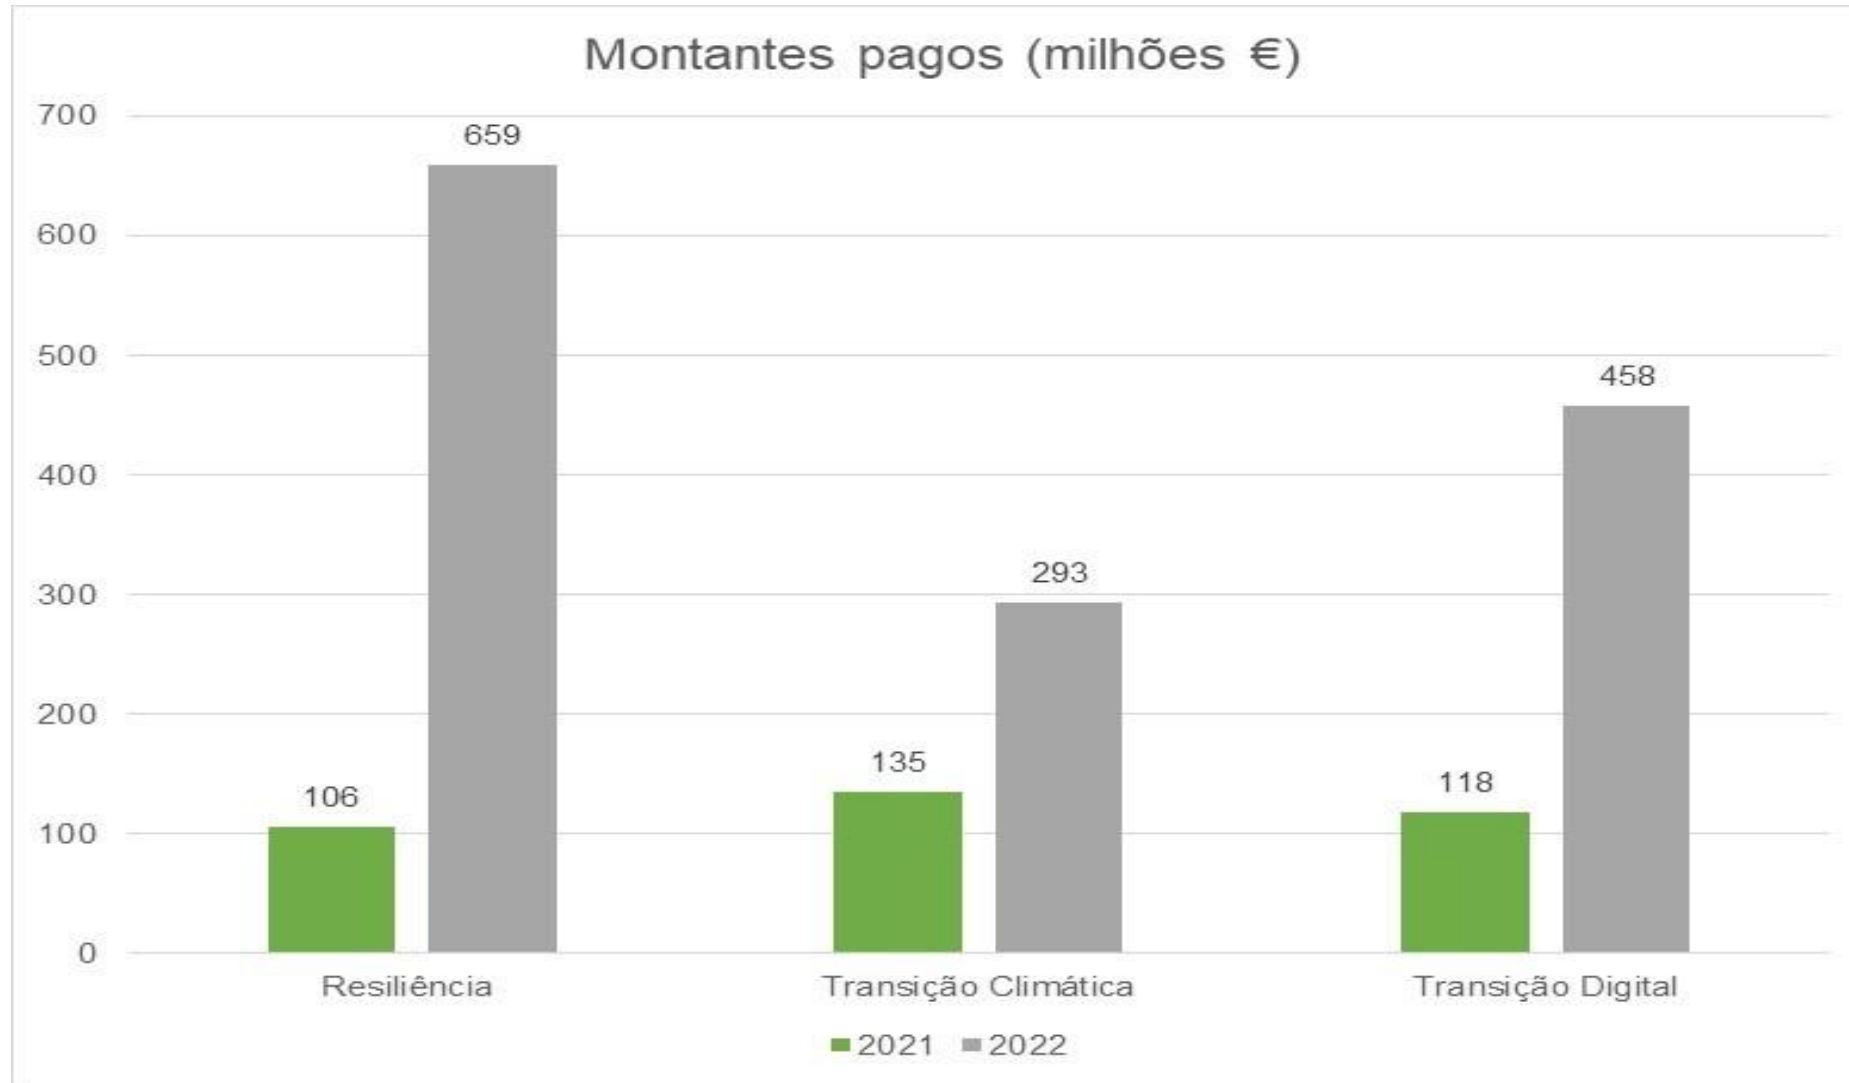

	Montante Aprovado (milhões €)		Montante Pago (milhões €)		Taxa de Pagamento (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Famílias	21	136	19	123	90,5%	90,4%
Instituições de Economia Solidária e Social	1	270	0	34	0,0%	12,6%
Empresas	0,1	2829	0,1	153	100,0%	5,4%
Instituições Sistema Científico e Tecnológico	0	131	0	9		6,9%
Instituições de Ensino Superior	0	609	0	41		6,7%
Escolas	228	247	30	212	13,2%	85,8%
Autarquias e Áreas Metropolitanas	120	1105	16	103	13,3%	9,3%
Entidades Públicas	1536	3437	140	455	9,1%	13,2%
Empresas Públicas	1614	2186	155	279	9,6%	12,8%
TOTAL	3520	10950	360	1410	10,2%	12,9%

Apreciação Crítica



Escala de apreciação

Alinhado com o Planeamento

Enquadrará medidas/investimentos que, para além de cumprirem com as metas definidas ou ser expectável o seu cumprimento, também não se identificam constrangimentos com prazos preparatórios, como sejam assinatura de contratos, lançamento de concursos públicos, défice de candidaturas ou outros relevantes

Necessário Acompanhamento

Enquadrará medidas/investimentos que, apesar de ser expectável o cumprimento das metas definidas, poderão ter sido identificados alguns atrasos, tais como assinatura de contratos, concursos desertos, entre outros

Preocupante

Enquadrará medidas/investimentos, que, não sendo de todo impossível o cumprimento de metas, identificam-se sinais preocupantes em termos de concretização junto dos beneficiários finais ou no âmbito de resultados expectáveis (p.ex. atrasos na comunicação de resultados de candidaturas ou assinaturas de contratos).

Crítico

Enquadrará medidas/investimentos cujo cumprimento de metas se identifiquem como muito difíceis de ser cumpridas (quer pela forma como foram definidas, quer pelo desenvolvimento das atividades até ao momento) e que carecem de intervenção de fundo por parte da tutela, do modelo de gestão, ou de redesenho das medidas.

Apreciação Crítica | Componentes e Investimentos

ALINHADO COM O PLANEAMENTO

33 (48%)

NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO

21 (30%)

PREOCUPANTE

13 (19%)

CRÍTICO

2
(3%)

Preocupantes/Críticos

Caracterização

Alguma concentração nos investimentos dirigidos a empresas

Habitação

Florestas

Digitalização Educação


Principais causas

Atrasos na avaliação das candidaturas

Atrasos no lançamento de concursos ou escassez de procura

Definição metas

Custos construção e redefinição projeto

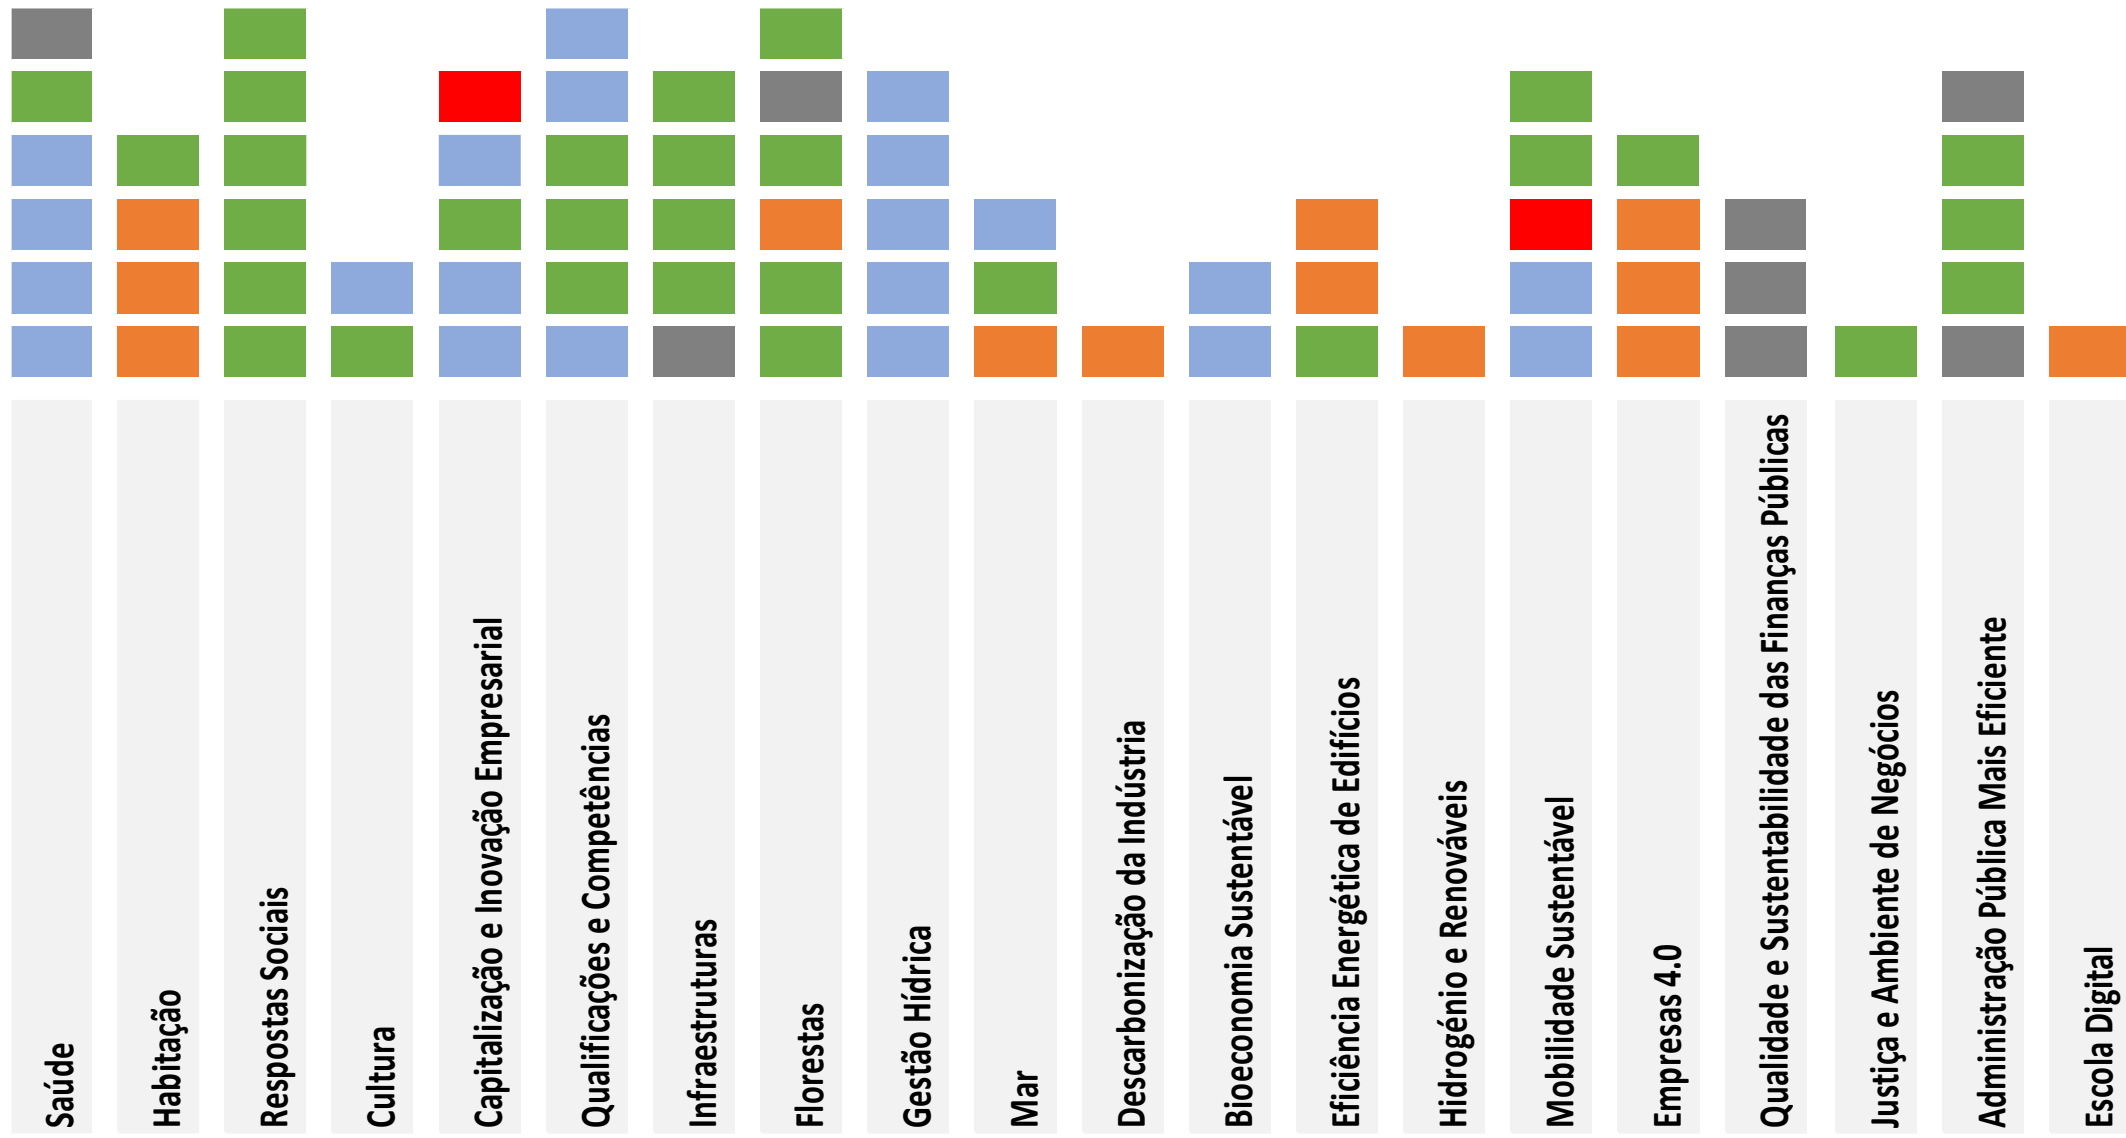

Balanço Global e Recomendações



Aspetos Positivos



1

Aprovação e reembolso dos dois pedidos de pagamento

2

Lançamento concursos, aprovações, contratos e arranque de investimentos por parte de vários BI e BD

3

Alterações legislativas promovidas pelo governo

4

Publicação plano anual de avisos e inclusão do Presidente na CNA-PRR no *workflow* de validação

5

Desenvolvimento do plano anual de auditorias por parte da EMRP

6

Elaboração relatório anual e semestral por parte da EMRP

7

Espírito colaborativo revelado pelos Ministérios, BD, BI e BF e constituição equipa CNA

Aspetos a Melhorar/Recomendações

1

Acelerar os processo de decisão de avaliação das candidaturas

2

Agilizar processos de autorizações administrativas e legislativas e promover maior cooperação entre entidades públicas

3

Introdução de mecanismo de consulta pública na preparação dos Avisos

4

Aumentar percentagem de reembolso dos adiantamentos

5

Reforçar e melhorar processo de comunicação

6

Melhoria dos tempos de resposta e reforço da interoperabilidade das plataformas

7

Reforçar a informação territorial dos investimentos e harmonização nos conceitos de reporte por parte dos BD e BI

Aspetos a Melhorar/Recomendações

8

Definir modelo de acompanhamento das Agendas Mobilizadoras

9

Apesar do reforço da informação no Portal Mais Transparência, deve reforçar-se o investimento na usabilidade, aspeto gráfico e criação de indicadores e *dashboard*

10

Atendendo ao processo de reprogramação em curso, sugere-se a recalendarização de alguns investimentos, o reforço financeiro, bem como algumas metas

11

Definição de programa e reforço de atividades dirigido à atração de RH

12

Definição de uma Agenda de Avaliação do PRR, com incidência nos resultados e nos impactos

13

Concretizar a execução do website da CNA-PRR



CNA | PRR

RELATÓRIO ANUAL 2022

